ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
BẢN DÙNG CHUNG CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG

Dành cho: **LÃNH ĐẠO BAN**

Phiên bản 1.7

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tin học Tri Thức

Cần Thơ, tháng 11 năm 2026

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Tên tài liệu	Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng – dành cho Lãnh đạo Ban
Mã tài liệu	HDSD-QLDA-XP-LD
Phiên bản	1.7
Ngày ban hành	08/11/2026
Đối tượng sử dụng	Cán bộ thuộc nhóm người dùng «Lãnh đạo Ban»
Cơ quan sử dụng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã/phường
Đơn vị soạn thảo	Công ty Cổ phần Tin học Tri Thức

Lịch sử thay đổi

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi	Người thực hiện
1.0	01/11/2026	Ban hành lần đầu, theo phần mềm phiên bản 1.0	Công ty CP Tin học Tri Thức
1.1	03/11/2026	Cập nhật theo phần mềm phiên bản 1.1: bổ sung Kế hoạch vốn – giải ngân, Giải phóng mặt bằng, Nghiệm thu – bàn giao – bảo hành, Quyết toán dự án hoàn thành; vai trò của Ban và người quyết định đầu tư; nhóm Lãnh đạo UBND xã	Công ty CP Tin học Tri Thức
1.2	03/11/2026	Cập nhật theo phần mềm phiên bản 1.2: trình duyệt hồ sơ (phụ lục hợp đồng, hồ sơ thanh toán, nghiệm thu); nhập ngày theo ngày/tháng/năm, phân trang danh sách, giao diện sáng/tối; bảng nhập công việc nhật ký; kế hoạch thanh toán theo đợt; in, xuất báo cáo PDF và CSV	Công ty CP Tin học Tri Thức
1.7	08/11/2026	Ban hành bộ hướng dẫn hợp nhất, trình bày đầy đủ các chức năng đang dùng: trình duyệt kế hoạch tiến độ; đợt nghiệm thu khối lượng có tư vấn giám sát xác nhận; nhập kế hoạch tiến độ, bảng khối lượng và khối lượng nghiệm thu từ tệp Excel; kiểm soát thanh toán theo giá trị đã nghiệm thu; xem trước tệp PDF; tùy chỉnh giao diện; biểu đồ tiến độ theo tuần, tháng, quý	Công ty CP Tin học Tri Thức

Thuật ngữ và từ viết tắt

Từ viết tắt	Ý nghĩa
BQLDA	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã/phường
QLDA	Quản lý dự án
HDSD	Hướng dẫn sử dụng
GPMB	Giải phóng mặt bằng
KBNN	Kho bạc Nhà nước
TVGS	Tư vấn giám sát
BOQ	Bảng khối lượng hợp đồng (Bill of Quantities)

Từ viết tắt	Ý nghĩa
QTHT	Quản trị hệ thống
Gantt	Biểu đồ tiến độ dạng thanh ngang theo thời gian

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU CHUNG....4
1.1. Mục đích tài liệu....4
1.2. Đối tượng sử dụng và phạm vi quyền....4
1.3. Quy ước trình bày....4
1.4. Yêu cầu về thiết bị....5
2. BẮT ĐẦU SỬ DỤNG....6
2.1. Đăng nhập hệ thống....6
2.2. Giao diện làm việc chính....6
2.3. Đổi mật khẩu và đăng xuất....7
2.4. Nhập ngày và xem danh sách dài....8
2.5. Tùy chỉnh giao diện....10
2.6. Đính kèm và xem tệp....11
2.7. Xem hướng dẫn sử dụng trong phần mềm....13
3. THEO DÕI, ĐIỀU HÀNH....15
3.1. Theo dõi Tổng quan tình hình thực hiện....15
3.2. Tra cứu gói thầu và hợp đồng....16
3.3. Theo dõi thanh toán, giải ngân....16
4. TRÌNH DUYỆT HỒ SƠ....18
4.1. Duyệt, trả lại, từ chối hồ sơ....18
4.2. Duyệt kế hoạch tiến độ và đợt nghiệm thu khối lượng....19
4.3. Thu hồi hồ sơ đã duyệt, xem lịch sử....20
5. QUẢN LÝ DỰ ÁN....22
5.1. Tra cứu danh sách dự án....22
5.2. Xem chi tiết dự án....22
5.3. Thêm mới, cập nhật thông tin dự án....24
5.4. Quản lý hồ sơ pháp lý dự án....25
5.5. Giao và theo dõi công việc....26
6. KẾ HOẠCH VỐN, GIẢI NGÂN....28
6.1. Lũy kế giải ngân theo quý....29
7. GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG....30
8. THEO DÕI TIẾN ĐỘ....31
8.1. Công cụ của biểu đồ tiến độ....32
9. NGHIỆM THU, BÀN GIAO, BẢO HÀNH....34
9.1. Theo dõi bảo hành công trình....34
10. QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH....36
11. KHAI THÁC BÁO CÁO, THỐNG KÊ....37
12. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ HỖ TRỢ....41

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này hướng dẫn cán bộ thuộc nhóm người dùng «Lãnh đạo Ban» sử dụng Phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã/phường (sau đây gọi là «phần mềm») để theo dõi tổng thể tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch vốn, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu và quyết toán; duyệt kế hoạch tiến độ, đợt nghiệm thu khối lượng, phụ lục hợp đồng, hồ sơ thanh toán và biên bản nghiệm thu; nắm bắt cảnh báo, chỉ đạo xử lý công việc và khai thác báo cáo phục vụ điều hành.

Nội dung được trình bày theo trình tự thao tác thực tế. Mỗi thao tác có hình minh họa chụp trực tiếp từ giao diện phần mềm; số liệu trên hình là số liệu minh họa.

1.2. Đối tượng sử dụng và phạm vi quyền

Tài khoản thuộc nhóm «Lãnh đạo Ban» được phân quyền mặc định như bảng dưới đây. Quản trị hệ thống có thể điều chỉnh quyền theo yêu cầu thực tế của Ban; khi đó phần mềm tự ẩn các chức năng không được phép sử dụng.

Bảng 1.1. *Quyền mặc định của nhóm «Lãnh đạo Ban»*

TT	Phân hệ chức năng	Quyền mặc định
1	Tổng quan	Chỉ xem
2	Quản lý dự án	Xem và cập nhật
3	Kế hoạch vốn, giải ngân	Chỉ xem
4	Giải phóng mặt bằng	Chỉ xem
5	Mô hình hóa công trình	Chỉ xem
6	Gói thầu và hợp đồng	Chỉ xem
7	Quản lý tiến độ	Chỉ xem
8	Nhật ký thi công	Chỉ xem
9	Quản lý khối lượng	Chỉ xem
10	Nghiệm thu, bàn giao, bảo hành	Chỉ xem
11	Quản lý thanh toán	Chỉ xem
12	Quyết toán dự án	Chỉ xem
13	Báo cáo, thống kê	Chỉ xem
14	Quản trị hệ thống	Chỉ xem

Phạm vi dữ liệu: tất cả dự án.

Nhóm Lãnh đạo Ban được cấp sẵn quyền **Duyệt hồ sơ**: duyệt, trả lại, từ chối và thu hồi kế hoạch tiến độ, đợt nghiệm thu khối lượng, phụ lục hợp đồng, hồ sơ thanh toán và biên bản nghiệm thu (xem chương **Trình duyệt hồ sơ**).

1.3. Quy ước trình bày

- Khung đỏ có số thứ tự trên hình minh họa chỉ vị trí cần thao tác; bảng chú giải ngay dưới hình giải thích ý nghĩa từng số.
- Tên nút, thẻ, mục chọn trên giao diện được in đậm, ví dụ: nhấn nút **Lưu**.
- Ô nhập liệu có dấu * màu đỏ là thông tin bắt buộc, không được bỏ trống.
- Ngày tháng nhập theo dạng ngày/tháng/năm (ví dụ 03/11/2026, hoặc gõ liền 03112026); số tiền tính bằng đồng.

1.4. Yêu cầu về thiết bị

- Máy tính: trình duyệt Google Chrome, Microsoft Edge hoặc Cốc Cốc phiên bản mới; độ phân giải màn hình khuyến nghị từ 1366 × 768 trở lên.
- Điện thoại: Android 7.0 trở lên dùng trình duyệt Chrome; iPhone dùng trình duyệt Safari. Có thể thêm phần mềm ra màn hình chính để mở như một ứng dụng.
- Kết nối: mạng nội bộ của Ban hoặc kết nối Internet/VPN theo hướng dẫn của quản trị hệ thống. Địa chỉ truy cập do quản trị hệ thống cung cấp.


2. BẮT ĐẦU SỬ DỤNG

2.1. Đăng nhập hệ thống

Bước 1. Mở trình duyệt, nhập địa chỉ phần mềm do quản trị hệ thống cung cấp.

Bước 2. Nhập **Tên đăng nhập (1)** và **Mật khẩu (2)** được cấp.

Bước 3. Nhấn nút **Đăng nhập (3)**. Phần mềm mở trang làm việc phù hợp với quyền của tài khoản.

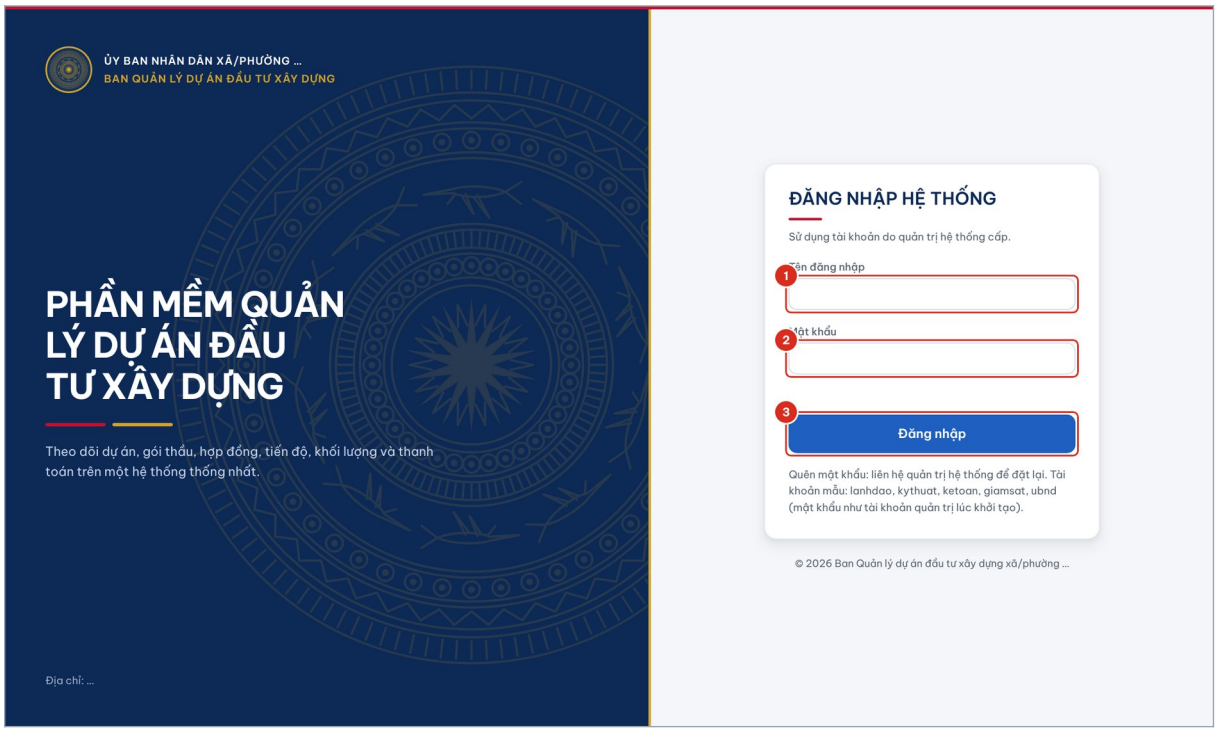


Hình 2.1. *Màn hình đăng nhập hệ thống*

Số	Ý nghĩa
1	Ô nhập tên đăng nhập
2	Ô nhập mật khẩu
3	Nút Đăng nhập

> ***Lưu ý:*** *Nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp, tài khoản bị tạm khóa 15 phút để chống dò mật khẩu. Quên mật khẩu, đề nghị quản trị hệ thống đặt lại; không chia sẻ mật khẩu cho người khác.*

2.2. Giao diện làm việc chính

Sau khi đăng nhập, giao diện gồm thanh chức năng bên trái, thanh công cụ phía trên và vùng làm việc ở giữa.

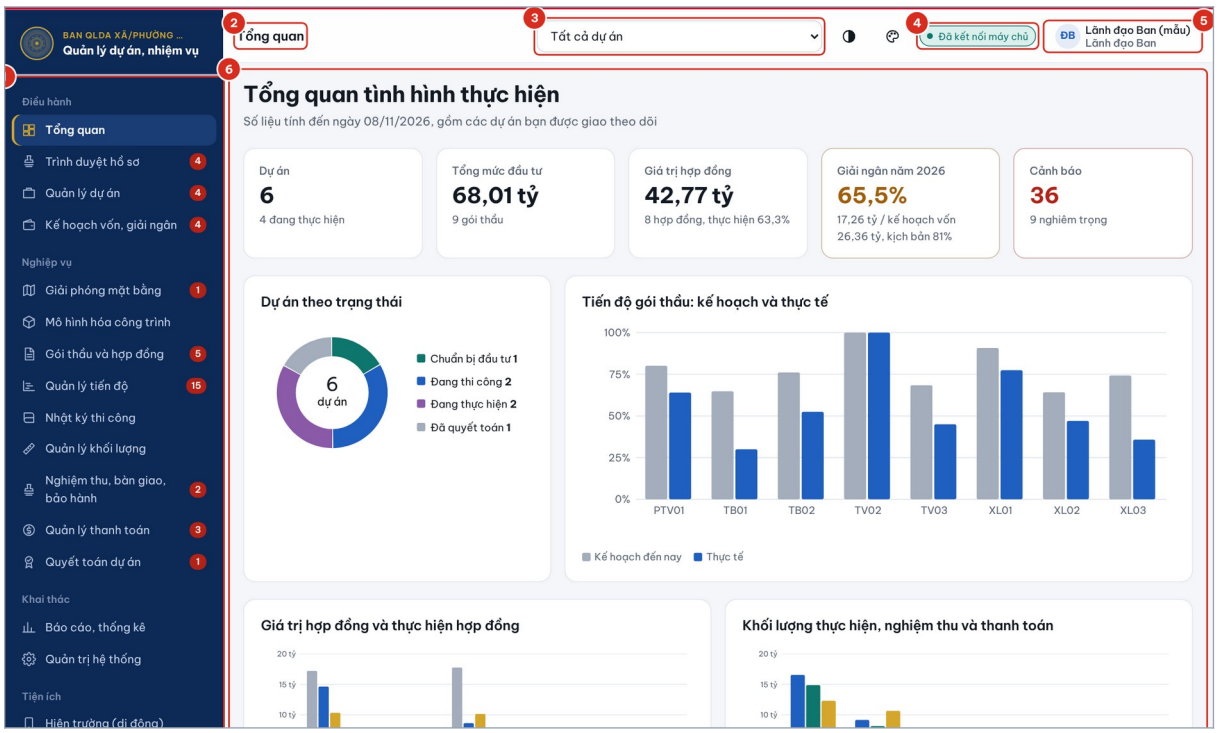

Hình 2.2. *Bố cục giao diện làm việc chính*


Số	Ý nghĩa
1	Thanh chức năng: danh sách phân hệ được phép sử dụng, nhóm theo Điều hành – Nghiệp vụ – Khai thác – Tiện ích. Số màu đỏ bên phải là số việc cần chú ý (ví dụ hạng mục chậm tiến độ, dự án chậm giải ngân, bảo hành sắp hết hạn).
2	Tên trang đang mở.
3	Ô chọn dự án làm việc: chọn một dự án để mọi trang chỉ hiển thị số liệu của dự án đó; chọn «Tất cả dự án» để xem toàn bộ.
4	Trạng thái kết nối: «Đã kết nối máy chủ» nghĩa là dữ liệu được lưu tập trung và tự làm mới khoảng 30 giây một lần.
5	Tài khoản đang đăng nhập; nhấn vào để đổi mật khẩu hoặc đăng xuất.
6	Vùng làm việc của trang đang mở.

2.3. Đổi mật khẩu và đăng xuất


Bước 1. Nhấn vào tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình. Hộp **Tài khoản** hiện thông tin người dùng.

Bước 2. Chọn **Đổi mật khẩu** (1), nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới (tối thiểu 8 ký tự, có cả chữ và số) và nhập lại mật khẩu mới, sau đó nhấn **Lưu**.

Bước 3. Kết thúc phiên làm việc, chọn **Đăng xuất** (2). Khi dùng máy tính dùng chung, luôn đăng xuất trước khi rời máy.

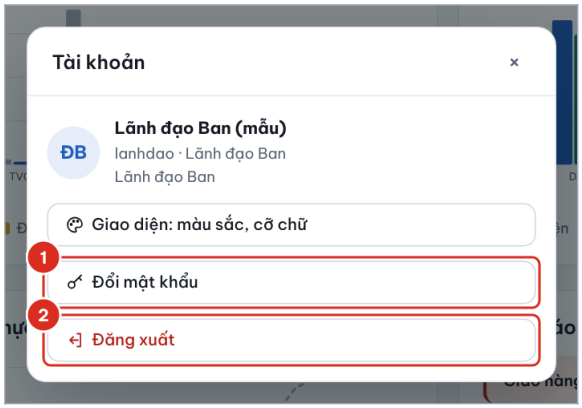

Hình 2.3. *Hộp thông tin tài khoản*

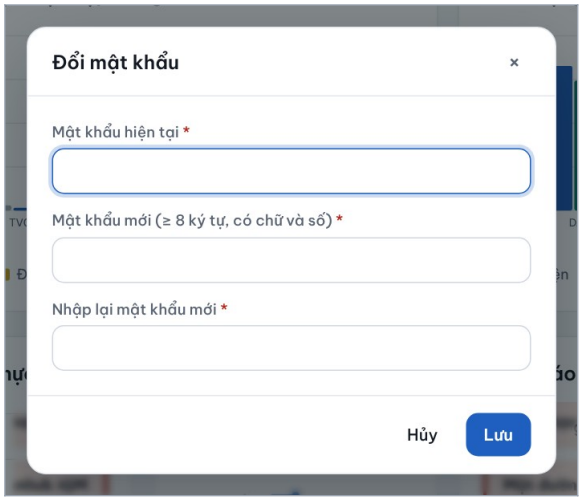


Hình 2.4. *Hộp đổi mật khẩu*

Số	Ý nghĩa
1	Đổi mật khẩu
2	Đăng xuất khỏi hệ thống

2.4. Nhập ngày và xem danh sách dài

Mọi ô ngày trong phần mềm đều nhập theo dạng **ngày/tháng/năm** **(1)**, không phụ thuộc cài đặt ngôn ngữ của máy tính. Có thể gõ đủ «03/11/2026» hoặc gõ liền «03112026», phần mềm tự thêm dấu «/». Muốn chọn trên lịch, nhấn biểu tượng lịch **(2)** bên phải ô. Ngày không hợp lệ (ví dụ 31/02) được tô đỏ và không cho lưu.

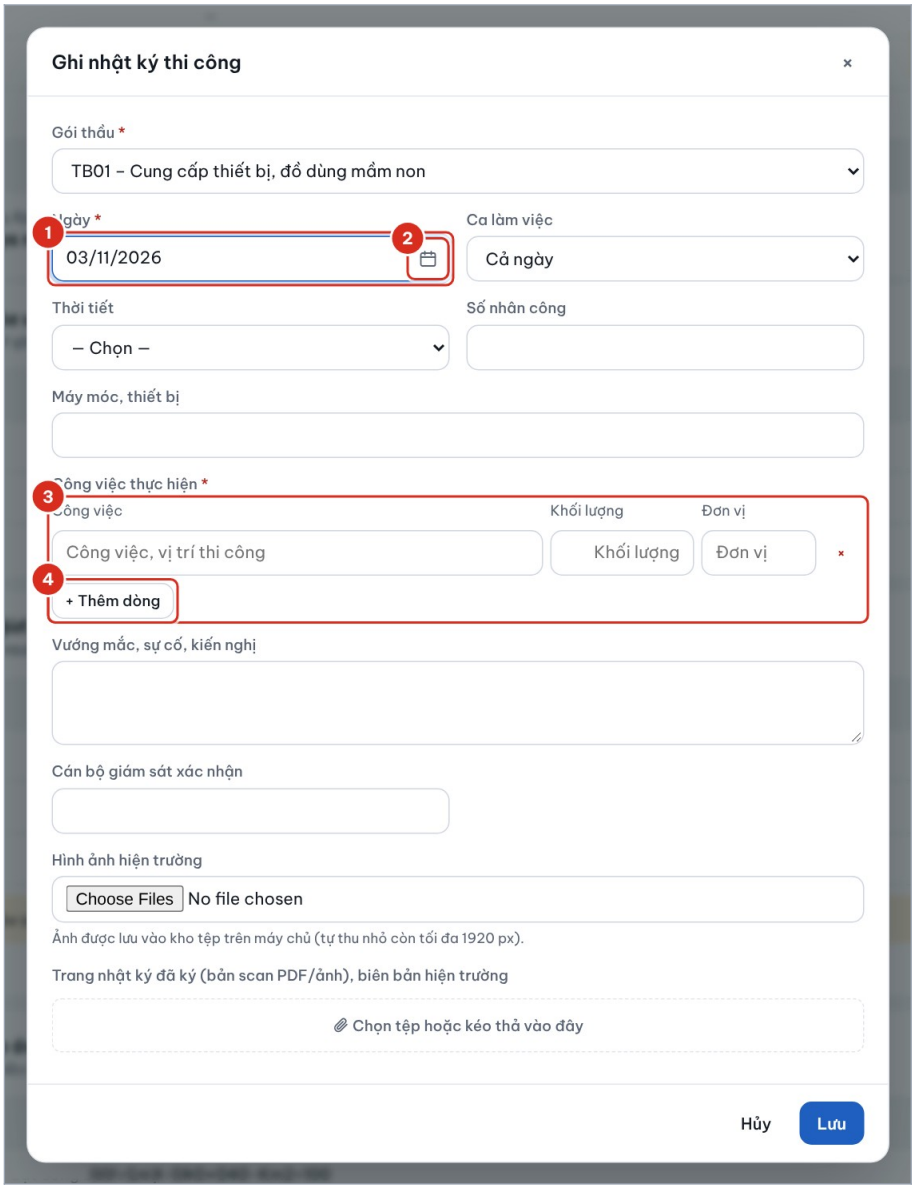

Hình 2.5. *Ô nhập ngày theo ngày/tháng/năm và bảng nhập công việc*

Số	Ý nghĩa
1	Ô nhập ngày: gõ ngày/tháng/năm
2	Chọn ngày trên lịch
3	Bảng nhập công việc: công việc, khối lượng, đơn vị
4	Thêm dòng công việc

Danh sách dài (hồ sơ, nhật ký, nhật ký hoạt động…) được chia trang, mặc định 20 dòng mỗi trang. Dùng các nút chuyển trang **(1)** phía dưới bảng; chọn số dòng mỗi trang **(2)**: 20, 50, 100 hoặc **Tất cả**. Lựa chọn được ghi nhớ cho lần sau. Khi đổi điều kiện lọc, danh sách tự quay về trang đầu.



Hình 2.6. *Thanh chuyển trang phía dưới danh sách*


Số	Ý nghĩa
1	Chuyển trang đầu, trang trước, trang sau, trang cuối
2	Chọn số dòng mỗi trang

Bảng có nhiều cột (ví dụ báo cáo tổng hợp, theo dõi thanh toán) cuộn ngang được: kéo thanh cuộn dưới bảng, hoặc giữ phím Shift và lăn chuột. Cột đầu tiên luôn đứng yên để dễ đối chiếu.

2.5. Tùy chỉnh giao diện

Mỗi người dùng chọn được chế độ sáng hoặc tối, tông màu, cỡ chữ và mật độ hiển thị theo thói quen của mình. Lựa chọn lưu theo tài khoản trên máy chủ: đăng nhập ở máy khác hoặc trên điện thoại, giao diện vẫn đúng như đã chọn; lựa chọn của người này không ảnh hưởng người khác.

Nút giao diện **(1)** ở thanh công cụ phía trên chuyển nhanh giữa ba chế độ: **Tự động theo máy** (sáng hoặc tối theo cài đặt của máy tính, điện thoại), **Giao diện sáng** và **Giao diện tối**. Giao diện tối giúp đỡ mỏi mắt khi làm việc lâu hoặc ban đêm; số liệu không thay đổi.

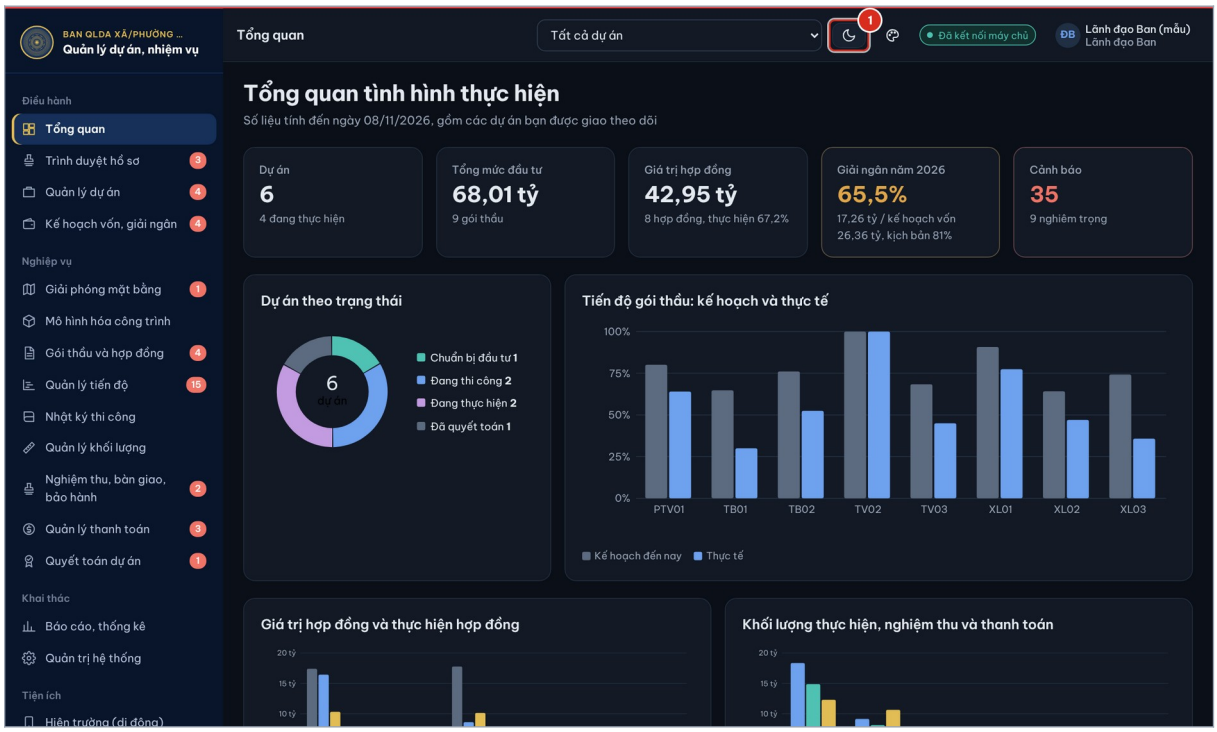


Hình 2.7. *Giao diện tối*

Số	Ý nghĩa
1	Nút chuyển giao diện sáng/tối

Muốn chọn chi tiết hơn, nhấn nút bảng màu bên cạnh nút sáng/tối, hoặc nhấn vào tên tài khoản và chọn **Giao diện: màu sắc, cỡ chữ** (trên điện thoại: **Menu → Giao diện, màu sắc**). Hộp **Giao diện** gồm:

- **Chế độ hiển thị**: Tự động theo máy, Sáng hoặc Tối.
- **Tông màu chủ đạo**: Xanh hành chính (mặc định), Xanh ngọc, Tím than, Xanh lá, Cam đất, Than chì; tông màu đổi màu thanh điều hướng, nút chính và biểu đồ.
- **Thanh điều hướng**: nền đậm theo tông màu hoặc nền sáng.
- **Cỡ chữ**: Nhỏ, Vừa, Lớn, Rất lớn. Nên chọn Lớn hoặc Rất lớn khi trình chiếu trong cuộc họp.
- **Mật độ hiển thị**: chọn Gọn để xem được nhiều dòng hơn trên một màn hình.

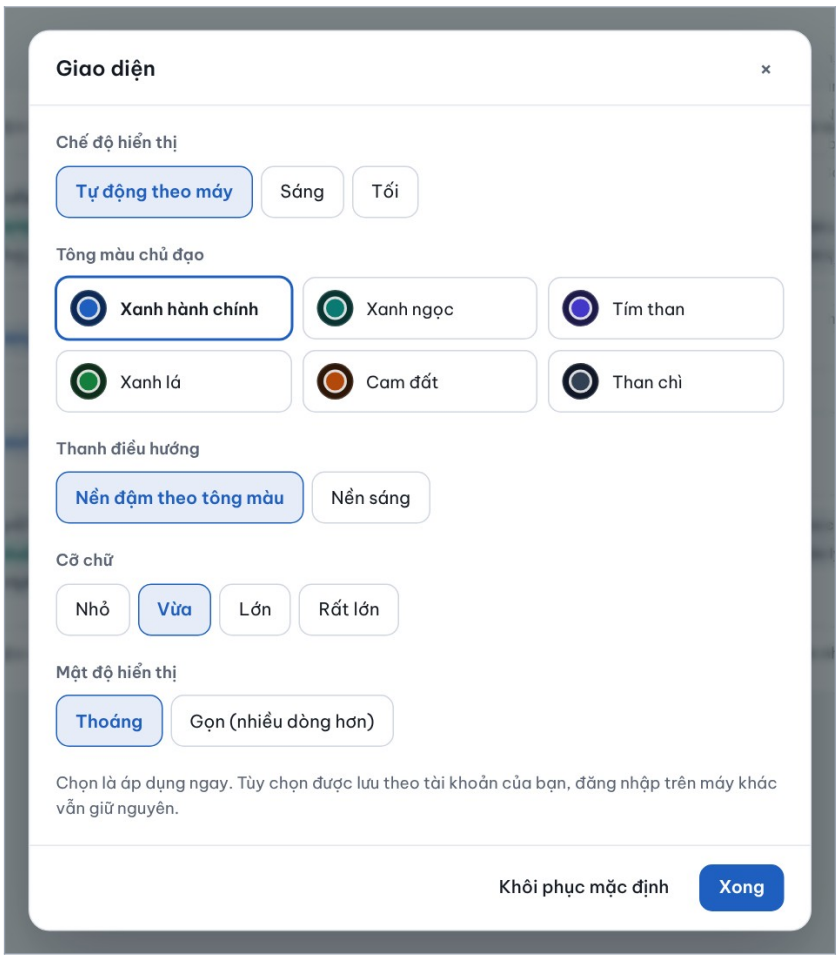

Hình 2.8. *Hộp tùy chỉnh giao diện*

Chọn đến đâu áp dụng ngay đến đó, không cần nhấn lưu. Nhấn **Khôi phục mặc định** để trở về giao diện ban đầu, nhấn **Xong** để đóng hộp.

2.6. Đính kèm và xem tệp


Các hộp nhập liệu có ô **đính kèm tệp** để lưu bản scan văn bản, hợp đồng, biên bản, chứng từ ngay cùng thông tin nhập: quyết định phê duyệt dự án, quyết định giao kế hoạch vốn, phương án bồi thường, quyết định phê duyệt kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng đã ký, bảo lãnh, phụ lục, kế hoạch tiến độ, nhật ký thi công, biên bản nghiệm thu, bàn giao, hồ sơ và chứng từ thanh toán, hồ sơ quyết toán, công việc được giao…

Bước 1. Trong hộp nhập liệu, tại ô đính kèm, nhấn **Chọn tệp** **(2)** và chọn một hoặc nhiều tệp trên máy; hoặc kéo thả tệp từ thư mục vào ô này. Trên điện thoại, nút này mở máy ảnh hoặc thư viện ảnh.

Bước 2. Tệp mới chọn hiện ngay bên dưới **(3)**, chưa được gửi lên máy chủ. Nhấn **Bỏ** để bỏ tệp chọn nhầm.

Bước 3. Nhấn **Lưu**. Thông tin và tệp được lưu cùng lúc; phần mềm ghi nhận người tải lên, thời điểm và dung lượng.


Bước 4. Tệp đã lưu trước đó hiện phía trên **(1)**: nhấn tên tệp để mở; muốn gỡ, nhấn **Gỡ** trên dòng tệp rồi nhấn **Lưu**.

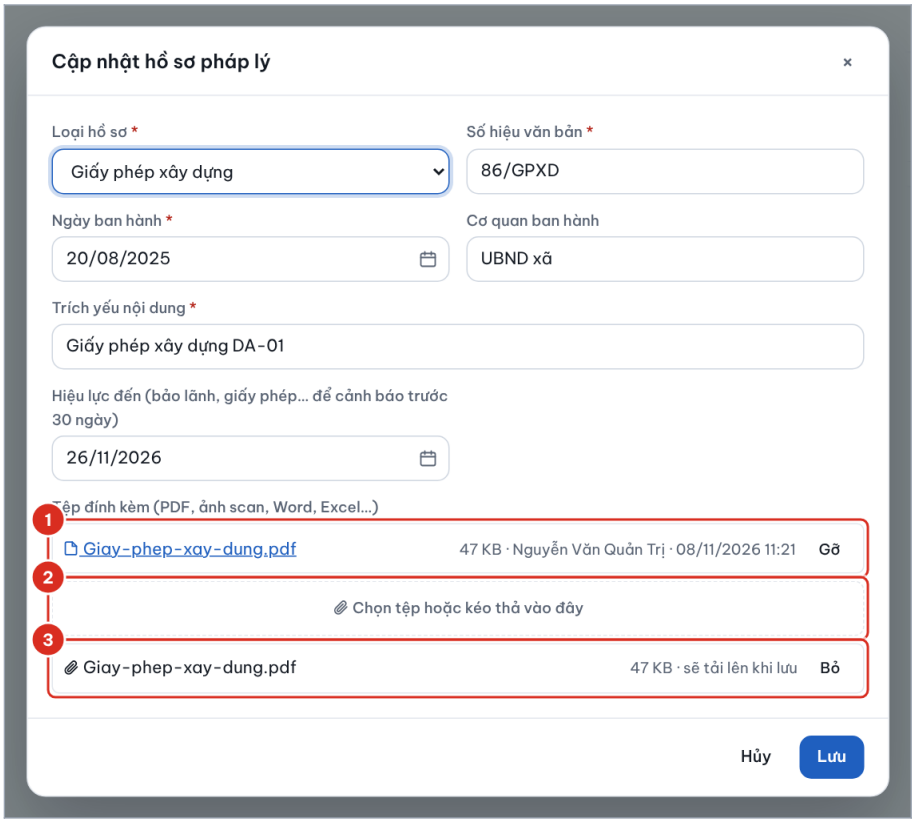

Hình 2.9. *Ô đính kèm tệp trong hộp nhập liệu*

Số	Ý nghĩa
1	Tệp đã lưu: tên tệp, dung lượng, người tải lên, thời điểm; nút Gỡ để gỡ tệp
2	Chọn tệp hoặc kéo thả tệp vào đây
3	Tệp mới chọn, sẽ tải lên khi nhấn Lưu

Trong các bảng danh sách, cột **Tệp** cho biết tệp đính kèm của từng dòng: nếu có một tệp, nhấn tên tệp để mở; nếu có nhiều tệp, nhấn nút **n tệp** để mở danh sách và chọn tệp cần xem. Ảnh mở ngay trên trình duyệt; tệp Word, Excel, bản vẽ… được tải về máy.

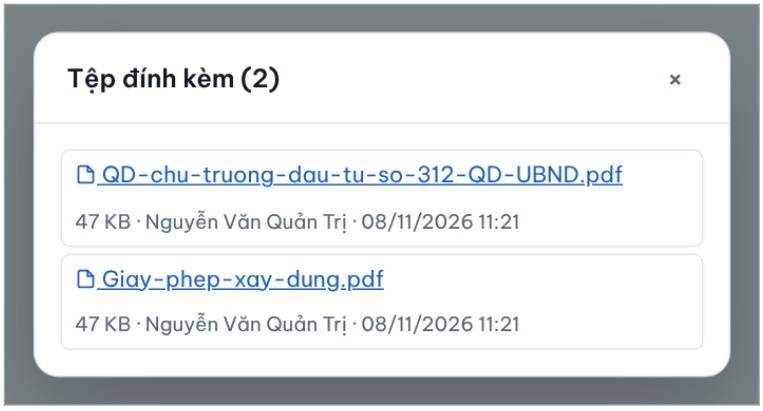

Hình 2.10. *Danh sách tệp đính kèm của một bản ghi*

Tệp PDF (quyết định, hợp đồng, biên bản, chứng từ, tệp mô hình dạng PDF…) mở ngay trong khung **xem trước** của phần mềm, không phải tải về. Thanh công cụ của khung có lật trang, phóng to, thu nhỏ, vừa khung, tải về và in.




Hình 2.11. *Xem trước tệp PDF ngay trên phần mềm*

> ***Lưu ý:*** *Mỗi tệp tối đa 500 MB; phần mềm không nhận tệp chương trình (.exe, .bat…). Tệp gỡ nhầm chưa mất ngay mà được chuyển vào thùng rác 30 ngày; đề nghị quản trị hệ thống khôi phục.*

2.7. Xem hướng dẫn sử dụng trong phần mềm

Chọn **Hướng dẫn sử dụng** ở cuối thanh chức năng bên trái (trên điện thoại: **Menu → Hướng dẫn**). Trang chỉ hiển thị tài liệu và video hướng dẫn dành cho nhóm người dùng của tài khoản đang đăng nhập; tài liệu này cũng có sẵn tại đây.

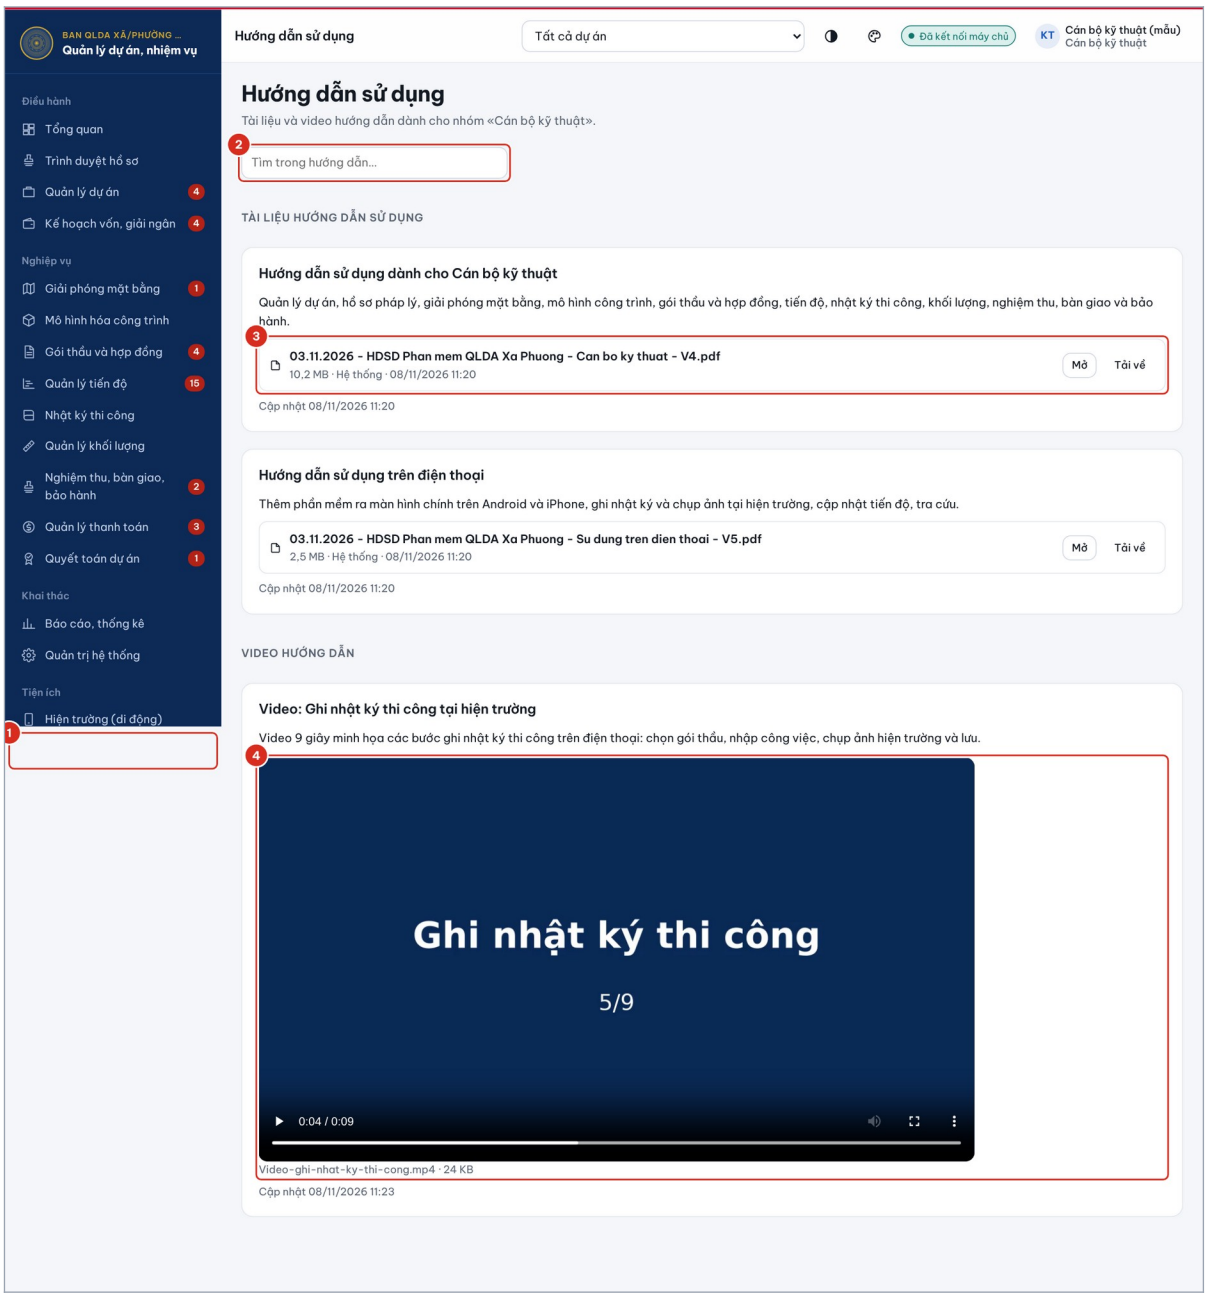

Hình 2.12. *Trang Hướng dẫn sử dụng theo nhóm người dùng*

Số	Ý nghĩa
1	Mục Hướng dẫn sử dụng trên thanh chức năng
2	Ô tìm kiếm trong hướng dẫn
3	Tài liệu hướng dẫn: nhấn Mở để xem ngay, Tải về để lưu vào máy
4	Video hướng dẫn: nhấn nút phát để xem

Lưu ý: *Nội dung trang Hướng dẫn sử dụng do quản trị hệ thống của Ban quản lý; khi có tài liệu mới, quản trị hệ thống đưa lên trang này để mọi người cùng dùng.*

3. THEO DÕI, ĐIỀU HÀNH

3.1. Theo dõi Tổng quan tình hình thực hiện

Trang **Tổng quan** tổng hợp số liệu của các dự án trong phạm vi được phân quyền, cập nhật tự động theo dữ liệu các bộ phận nhập.




Hình 3.1. *Trang Tổng quan tình hình thực hiện*

Số	Ý nghĩa
1	Các chỉ tiêu chính: số dự án, tổng mức đầu tư, giá trị hợp đồng, giải ngân năm so với kế hoạch vốn và kịch bản đến ngày hiện tại, số cảnh báo (ô đỏ khi có cảnh báo nghiêm trọng).
2	Biểu đồ: dự án theo trạng thái; tiến độ kế hoạch và thực tế từng gói thầu; giá trị hợp đồng; khối lượng thực hiện – nghiệm thu – thanh toán; đường cong S so sánh kế hoạch và thực tế.
3	Cảnh báo và việc cần xử lý: hạng mục quá hạn, chậm so với kế hoạch, công việc sắp đến hạn; bảo lãnh hợp đồng, giấy phép và văn bản pháp lý sắp hết hiệu lực (trước 30 ngày) hoặc đã hết hiệu lực; dự án chậm giải ngân so với kịch bản; bảo hành, bảo lãnh bảo hành sắp hết hạn; quyết toán quá hạn; khu vực chậm bàn giao mặt bằng; đợt thanh toán quá hạn theo kế hoạch (tô đỏ khi quá hạn trên 30 ngày); hồ sơ đang chờ duyệt. Nhấn **Xem** để mở ngay nội dung cần xử lý.
4	Bảng tình hình thực hiện các dự án; nhấn tên dự án để mở chi tiết.

Muốn xem riêng một dự án, chọn dự án tại ô chọn dự án trên thanh công cụ phía trên; toàn bộ chỉ tiêu và biểu đồ tự tính lại theo dự án đã chọn.

3.2. Tra cứu gói thầu và hợp đồng

Chọn **Gói thầu và hợp đồng**, nhấn vào một gói thầu để xem: thông tin hợp đồng **(1)** gồm số hợp đồng, nhà thầu, giá trị, thời gian, bảo lãnh, tạm ứng, thời hạn bảo lãnh và tệp bản hợp đồng đã ký, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng; theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng **(2)** so sánh tiến độ thời gian với tiến độ thi công, giá trị thực hiện, nghiệm thu và thanh toán; các phụ lục điều chỉnh và hồ sơ pháp lý của gói thầu (quyết định phê duyệt kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu) kèm tệp.

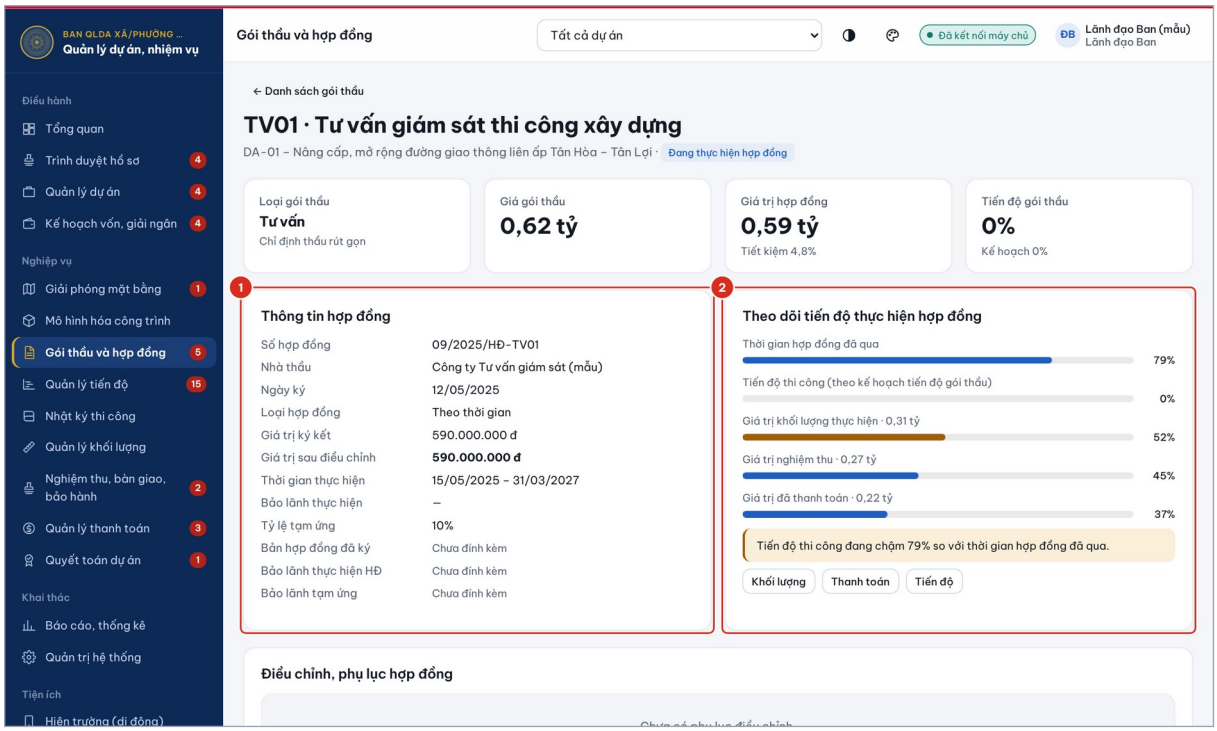


Hình 3.2. *Chi tiết gói thầu và hợp đồng*

Số	Ý nghĩa
1	Thông tin hợp đồng
2	Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng và cảnh báo

3.3. Theo dõi thanh toán, giải ngân

Phân hệ **Quản lý thanh toán** cho biết giá trị hợp đồng, đã thanh toán, đang đề nghị và kế hoạch năm **(1)**. Các thẻ **(2)** cho phép xem chi tiết theo dõi đã thanh toán, kế hoạch thanh toán, hồ sơ thanh toán và tổng hợp theo quý.

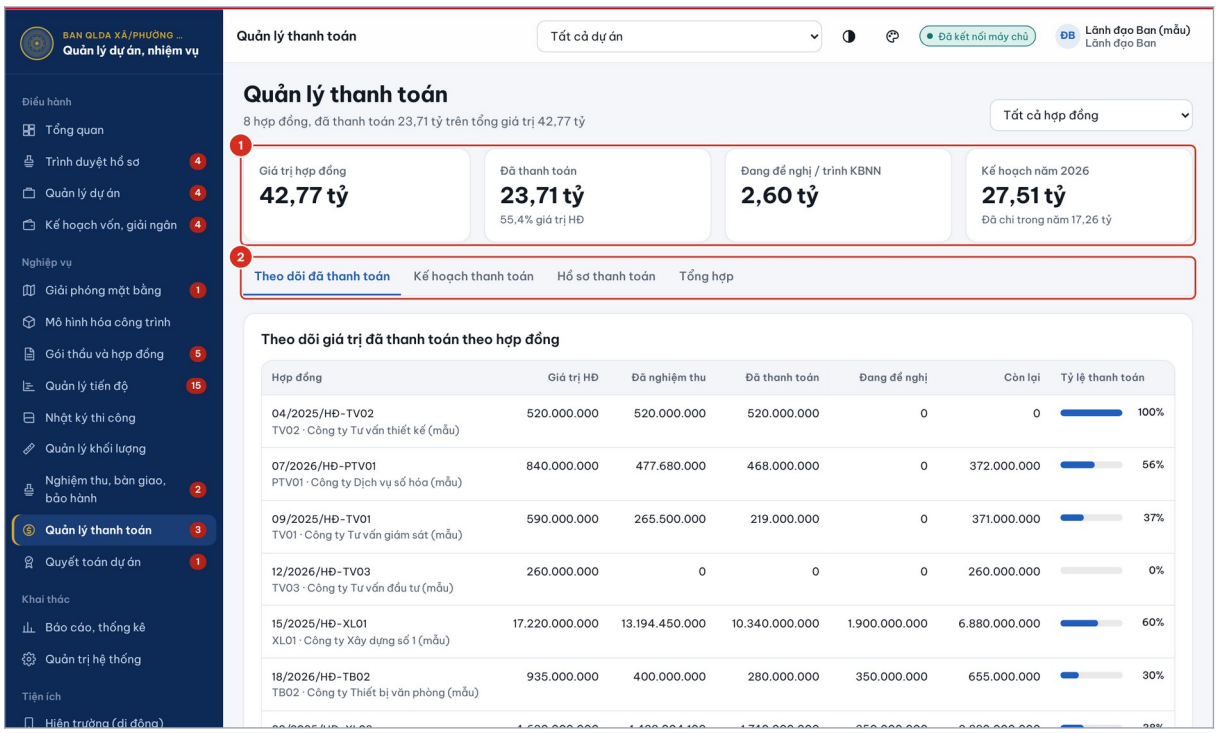

Hình 3.3. *Theo dõi thanh toán*

Số	Ý nghĩa
1	Các chỉ tiêu thanh toán chính
2	Các thẻ theo dõi chi tiết

4. TRÌNH DUYỆT HỒ SƠ

Kế hoạch tiến độ, đợt nghiệm thu khối lượng, phụ lục hợp đồng, hồ sơ thanh toán và biên bản nghiệm thu được quản lý theo quy trình trình duyệt: **người lập** lưu hồ sơ ở trạng thái soạn thảo và nhấn **Trình duyệt**; **Lãnh đạo Ban** (người được cấp quyền Duyệt hồ sơ) xem và **Duyệt**, **Trả lại** kèm ý kiến hoặc **Từ chối**. Với loại hồ sơ có **bước kiểm tra** (mặc định là đợt nghiệm thu khối lượng), hồ sơ sau khi trình phải được người kiểm tra (Tư vấn giám sát) xác nhận rồi mới đến Lãnh đạo Ban. Chỉ hồ sơ đã duyệt mới được tính vào số liệu.

Bảng 4.1. *Các loại hồ sơ theo quy trình trình duyệt*

Hồ sơ	Người lập	Trạng thái khi lưu	Khi được duyệt
Kế hoạch tiến độ	Cán bộ kỹ thuật	Soạn thảo	Đã duyệt: tính vào tiến độ kế hoạch, thực tế và cảnh báo chậm tiến độ
Đợt nghiệm thu khối lượng	Cán bộ kỹ thuật; Tư vấn giám sát xác nhận	Dự thảo	Đã nghiệm thu: tính vào khối lượng nghiệm thu, báo cáo và điều kiện thanh toán
Phụ lục hợp đồng	Cán bộ kỹ thuật	Soạn thảo	Đã duyệt: cộng vào giá trị, thời hạn hợp đồng
Hồ sơ thanh toán	Kế toán	Đề nghị	Đang trình KBNN; Kế toán xác nhận đã chi khi Kho bạc chi
Biên bản nghiệm thu, bàn giao	Cán bộ kỹ thuật	Soạn thảo	Đã duyệt

Trang **Trình duyệt hồ sơ** (ngay dưới Tổng quan trên thanh chức năng) gom tất cả hồ sơ ở một nơi, gồm các thẻ: **Chờ tôi xử lý**, **Đang chờ duyệt**, **Đang soạn thảo, bị trả lại** và **Lịch sử duyệt**. Số màu đỏ bên cạnh tên trang là số hồ sơ đang chờ tài khoản xử lý (duyệt hoặc xác nhận).

4.1. Duyệt, trả lại, từ chối hồ sơ


Bước 1. Chọn **Trình duyệt hồ sơ (1)** trên thanh chức năng. Thẻ **Chờ tôi xử lý (2)** liệt kê hồ sơ đang chờ, kèm loại hồ sơ, dự án, giá trị, nội dung và người trình.

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ; cần xem chi tiết hoặc tệp đính kèm, mở hồ sơ tại phân hệ tương ứng (Quản lý tiến độ, Quản lý khối lượng, Gói thầu và hợp đồng, Quản lý thanh toán, Nghiệm thu).

Bước 3. Nhấn **Duyệt (3)** nếu đồng ý; nhập ý kiến (không bắt buộc) và nhấn **Duyệt** trong hộp xác nhận.

Bước 4. Nhấn **Trả lại (4)** khi hồ sơ cần sửa, bổ sung: bắt buộc ghi ý kiến để người lập biết cần làm gì. Hồ sơ về soạn thảo cho người lập sửa và trình lại.

Bước 5. Nhấn **Từ chối (5)** khi không chấp thuận hồ sơ: bắt buộc ghi lý do. Hồ sơ bị từ chối không được tính vào số liệu.

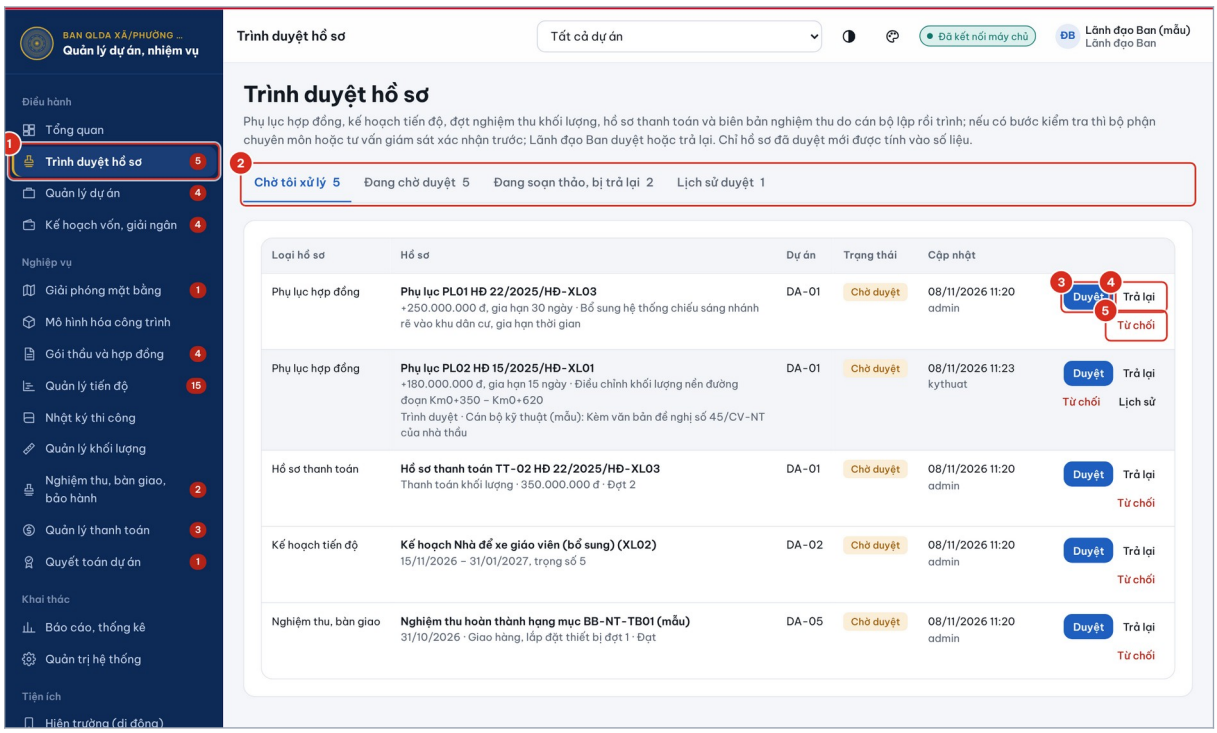


Hình 4.1. *Trang Trình duyệt hồ sơ, thẻ Chờ tôi duyệt*

Số	Ý nghĩa
1	Trang Trình duyệt hồ sơ và số hồ sơ chờ duyệt
2	Các thẻ: Chờ tôi xử lý – Đang chờ duyệt – Đang soạn thảo, bị trả lại – Lịch sử duyệt
3	Duyệt hồ sơ
4	Trả lại hồ sơ kèm ý kiến
5	Từ chối hồ sơ

4.2. Duyệt kế hoạch tiến độ và đợt nghiệm thu khối lượng


Kế hoạch tiến độ **(2)** do Cán bộ kỹ thuật trình hiện ngay trong thẻ **Chờ tôi xử lý**: kiểm tra tên công việc, thời gian và trọng số rồi duyệt. Sau khi duyệt, ngày và trọng số bị khóa, cán bộ chỉ cập nhật phần trăm hoàn thành; muốn sửa kế hoạch, nhấn **Thu hồi** để trả về soạn thảo.

Đợt nghiệm thu khối lượng **(1)** chỉ đến Lãnh đạo Ban sau khi Tư vấn giám sát đã xác nhận khối lượng. Dòng hồ sơ ghi số biên bản, ngày, số công việc và giá trị nghiệm thu của đợt; mở **Quản lý khối lượng** → thẻ **Theo dõi nghiệm thu** để xem từng công việc trước khi nhấn **Duyệt (3)**. Từ lúc duyệt, khối lượng nghiệm thu của đợt mới được tính vào số liệu hợp đồng và làm căn cứ thanh toán.

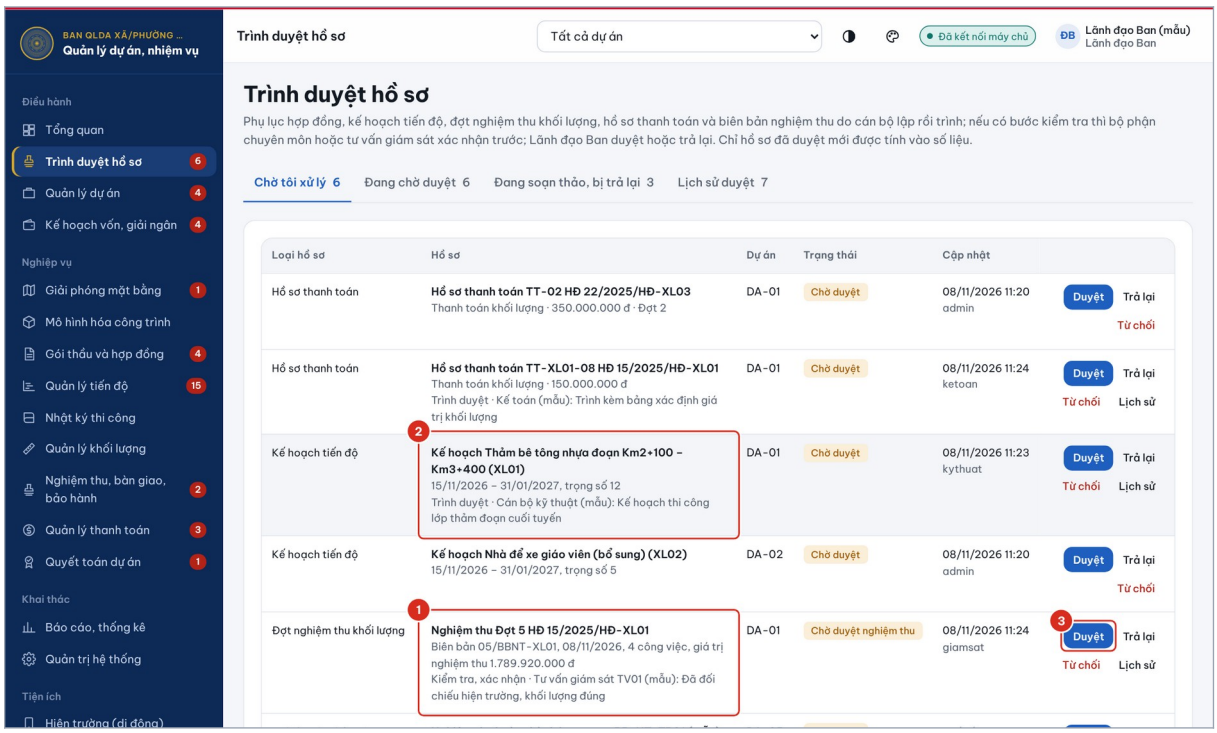


Hình 4.2. *Đợt nghiệm thu và kế hoạch tiến độ chờ Lãnh đạo Ban duyệt*

Số	Ý nghĩa
1	Đợt nghiệm thu khối lượng đã được Tư vấn giám sát xác nhận
2	Kế hoạch tiến độ chờ duyệt
3	Duyệt đợt nghiệm thu

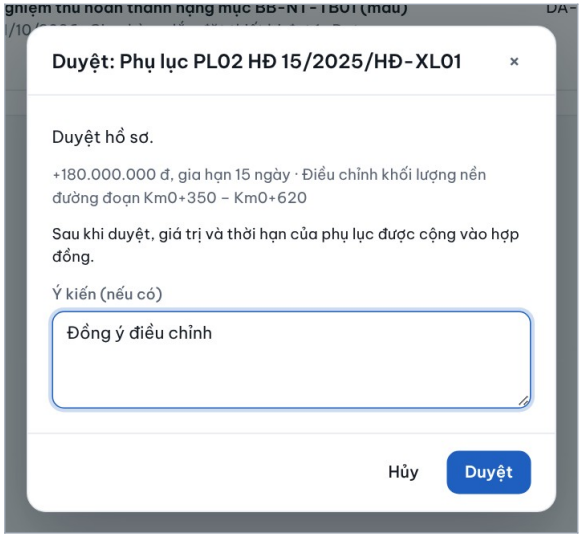


Hình 4.3. *Hộp xác nhận duyệt*

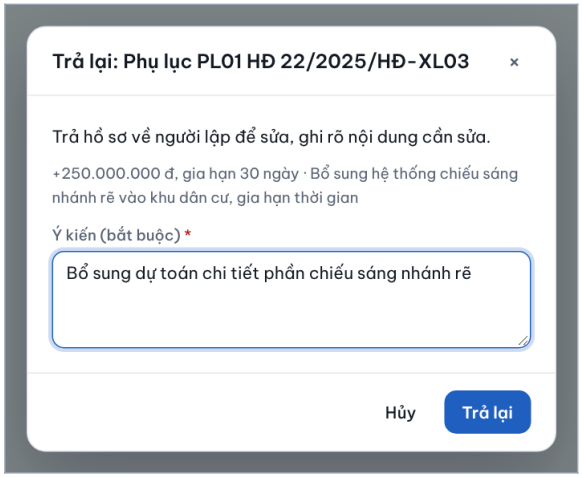

Hình 4.4. *Hộp trả lại hồ sơ: bắt buộc ghi ý kiến*

4.3. Thu hồi hồ sơ đã duyệt, xem lịch sử


Hồ sơ đã duyệt bị khóa với người lập. Khi cần điều chỉnh, nhấn **Thu hồi** (1) trên dòng hồ sơ và ghi lý do: hồ sơ về soạn thảo để người lập sửa và trình lại. Hồ sơ thanh toán đã được Kho bạc chi thì không thu hồi được. Nhấn **Lịch sử** (2) để xem toàn bộ quá trình trình, duyệt, trả lại của một hồ sơ.

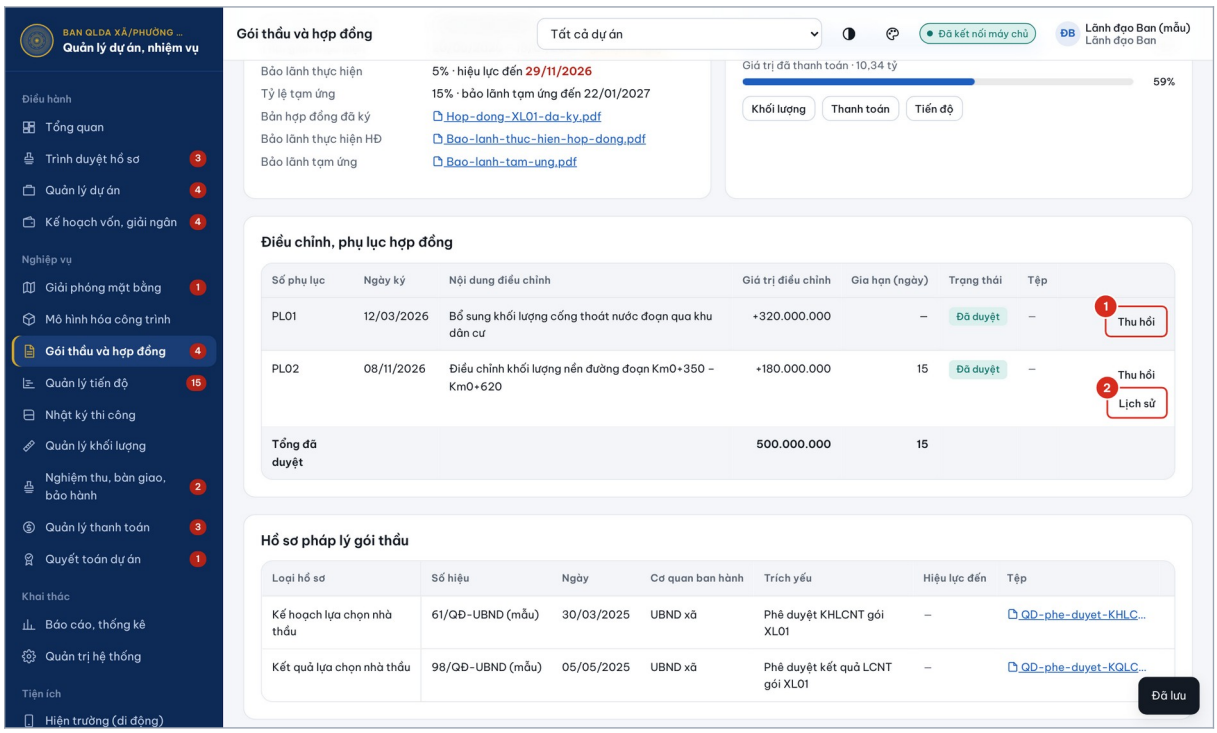

Hình 4.5. *Thu hồi và xem lịch sử của phụ lục đã duyệt*

Số	Ý nghĩa
1	Thu hồi hồ sơ đã duyệt về soạn thảo
2	Lịch sử trình duyệt của hồ sơ

Thẻ **Lịch sử duyệt** ghi lại mọi lần trình, duyệt, trả lại, từ chối, thu hồi: thời gian, hồ sơ, thao tác, người thực hiện và ý kiến. Lịch sử do máy chủ ghi, không sửa, xóa được, làm căn cứ khi kiểm tra, thanh tra.

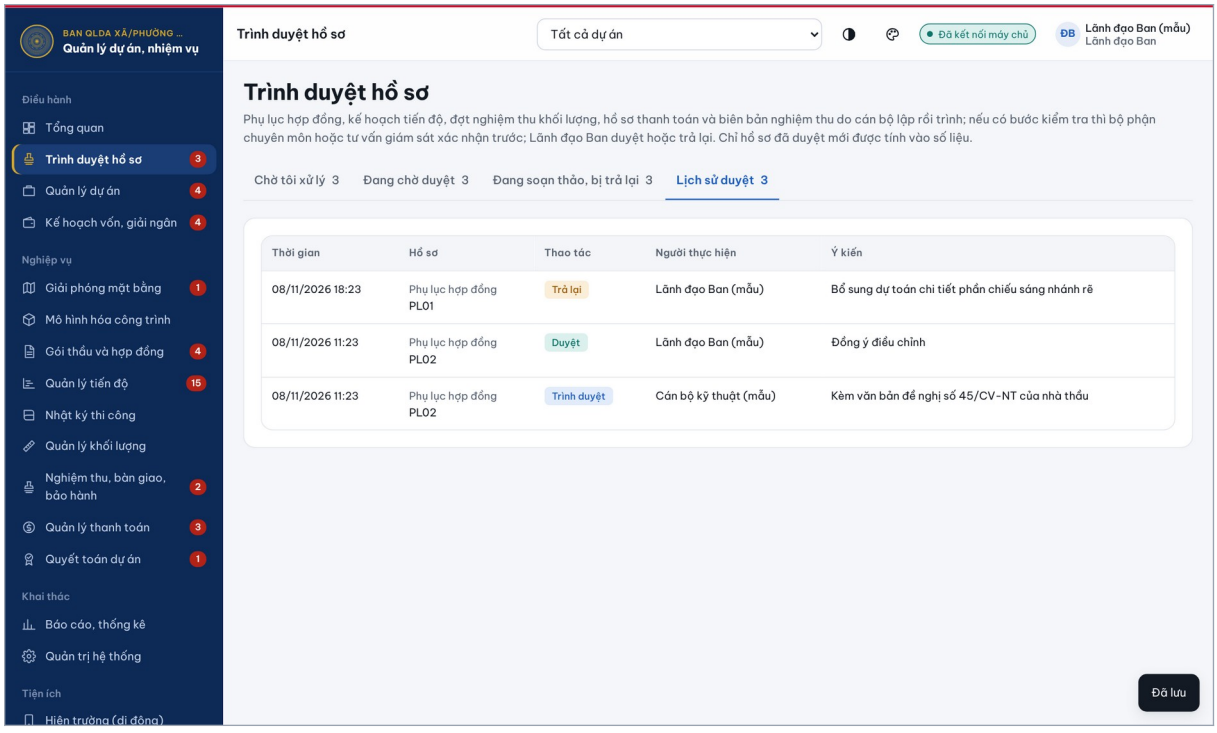


Hình 4.6. *Lịch sử duyệt hồ sơ*

5. QUẢN LÝ DỰ ÁN

5.1. Tra cứu danh sách dự án

Chọn **Quản lý dự án** trên thanh chức năng để xem danh sách các dự án kèm trạng thái, tổng mức đầu tư, số gói thầu, thời gian thực hiện và tiến độ.

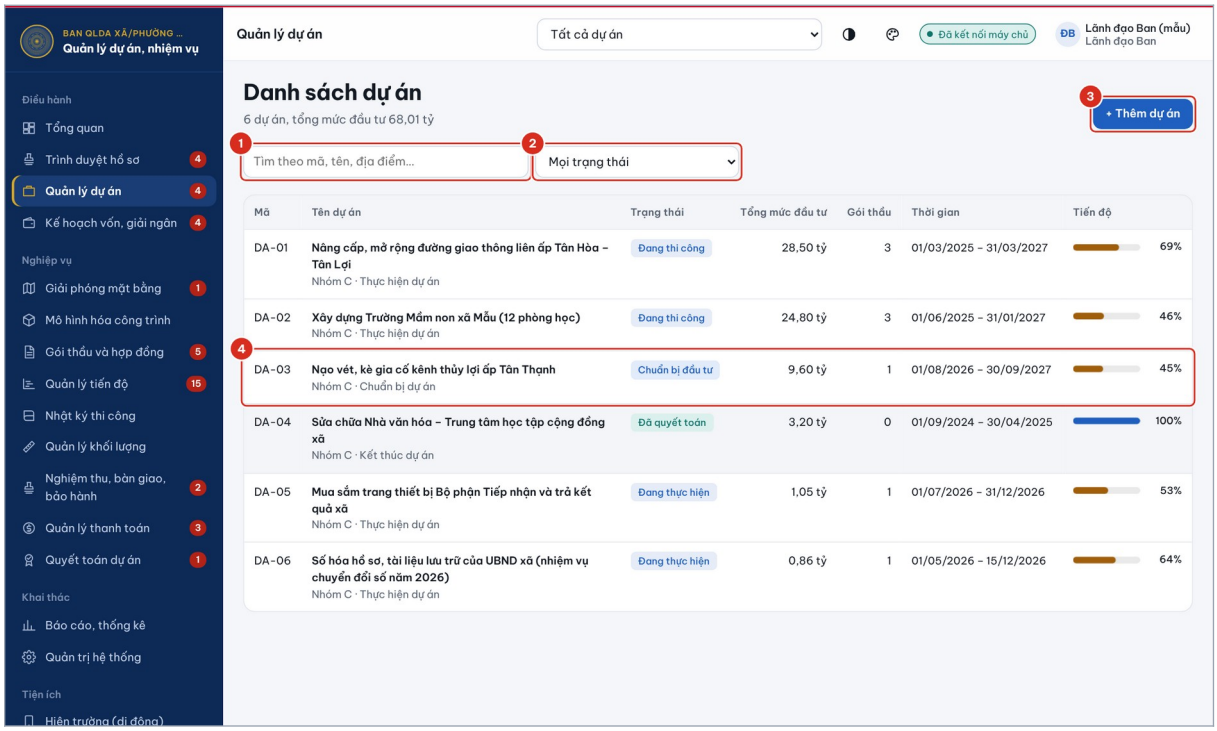


Hình 5.1. *Danh sách dự án*

Số	Ý nghĩa
1	Ô tìm kiếm theo mã, tên, địa điểm dự án
2	Lọc theo trạng thái dự án
3	Thêm dự án mới (chỉ hiện với tài khoản có quyền cập nhật)
4	Nhấn vào một dòng để mở chi tiết dự án

5.2. Xem chi tiết dự án


Trang chi tiết dự án gồm 04 thẻ (1): **Thông tin chung**, **Công việc**, **Hồ sơ pháp lý**, **Tình trạng thực hiện**. Nút **Sửa thông tin** (2) dùng để cập nhật thông tin dự án; nút **Danh sách dự án** (3) để quay lại.

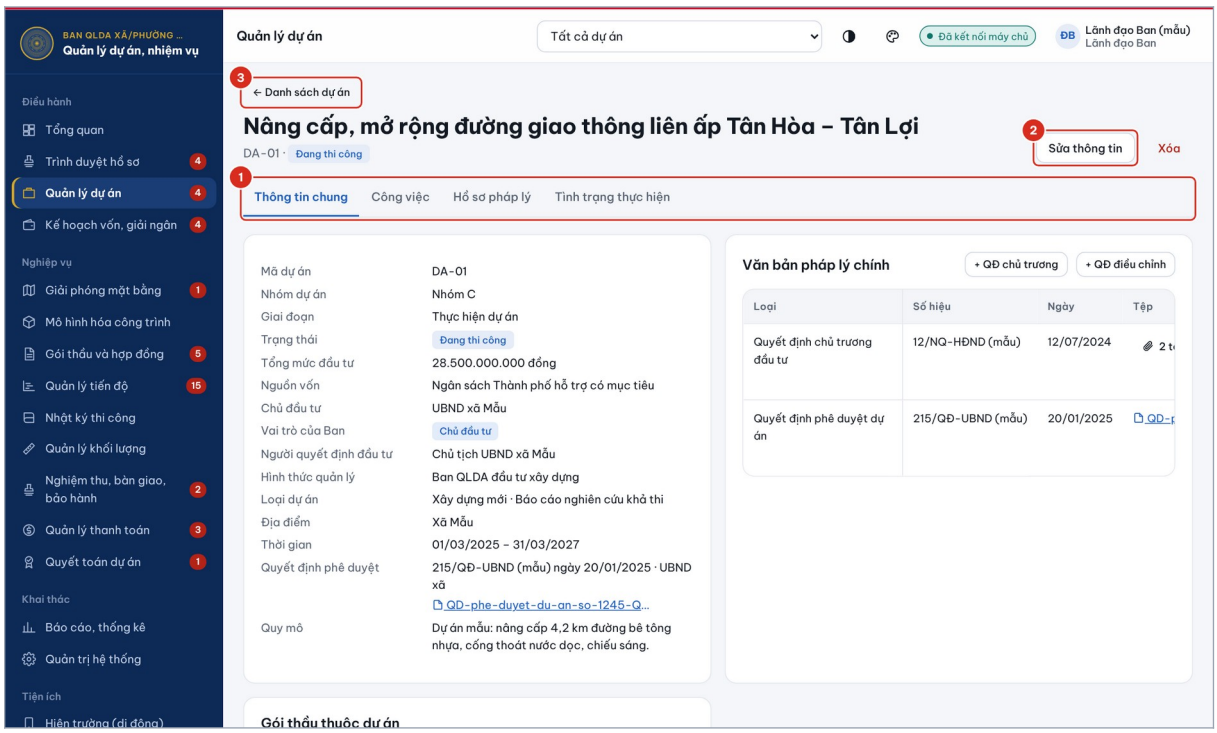

Hình 5.2. *Thông tin chung của dự án*

Số	Ý nghĩa
1	Các thẻ thông tin của dự án
2	Sửa thông tin dự án
3	Quay lại danh sách dự án

Thẻ **Tình trạng thực hiện** thể hiện các chỉ tiêu tiến độ, giá trị hợp đồng, giải ngân; đường cong S kế hoạch – thực tế của dự án; tình trạng từng gói thầu và các cảnh báo liên quan.

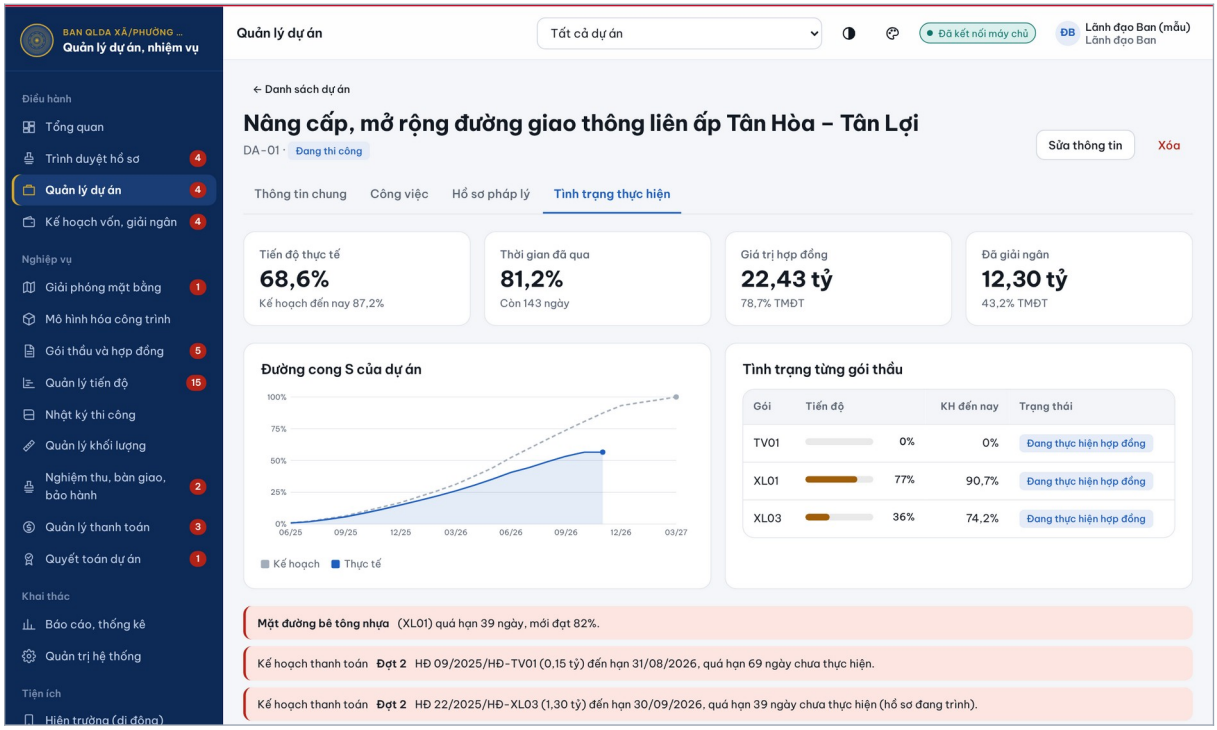

Hình 5.3. *Tình trạng thực hiện dự án*

5.3. Thêm mới, cập nhật thông tin dự án


Bước 1. Tại danh sách dự án, nhấn **+ Thêm dự án**; hoặc tại trang chi tiết dự án, nhấn **Sửa thông tin**.

Bước 2. Nhập mã dự án, tên dự án, trạng thái, tổng mức đầu tư (bắt buộc) và các thông tin: nhóm dự án, loại dự án, giai đoạn, nguồn vốn, thời gian, địa điểm, quy mô.

Bước 3. Chọn **Vai trò của Ban** đối với dự án (chủ đầu tư, quản lý dự án hoặc tư vấn quản lý dự án), **Hình thức quản lý dự án**, **Hồ sơ dự án** (báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi); nhập **Chủ đầu tư** và **Người quyết định đầu tư** (mặc định: Chủ tịch UBND xã/phường).

Bước 4. Tại phần **Quyết định phê duyệt dự án (1)**, nhập số quyết định, ngày ban hành, cơ quan ban hành và đính kèm bản scan quyết định **(2)**.


Bước 5. Nhấn **Lưu**. Quyết định được lưu thành hồ sơ pháp lý của dự án (loại «Quyết định phê duyệt dự án») kèm tệp; phần mềm ghi nhận người cập nhật và thời điểm vào nhật ký hoạt động.

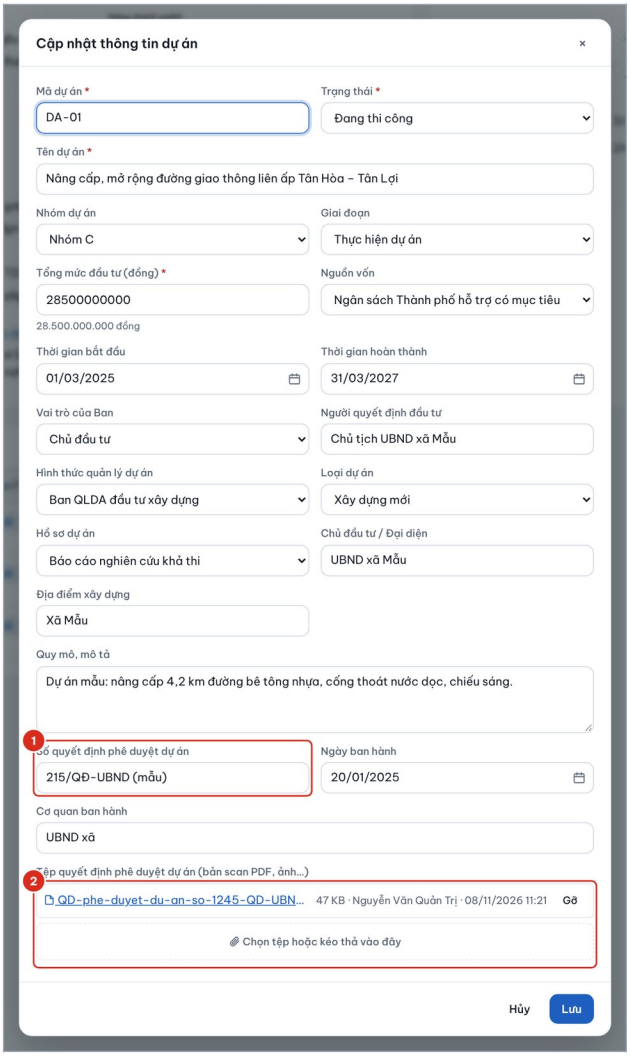

Hình 5.4. *Hộp nhập thông tin dự án*

Số	Ý nghĩa
1	Số, ngày, cơ quan ban hành quyết định phê duyệt dự án
2	Đính kèm bản scan quyết định phê duyệt dự án

Thẻ **Thông tin chung** của dự án có khung **Văn bản pháp lý chính** (1) liệt kê quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt và các quyết định điều chỉnh dự án kèm tệp. Nhấn **+ QĐ chủ trương** hoặc **+ QĐ điều chỉnh** (2) để bổ sung nhanh.

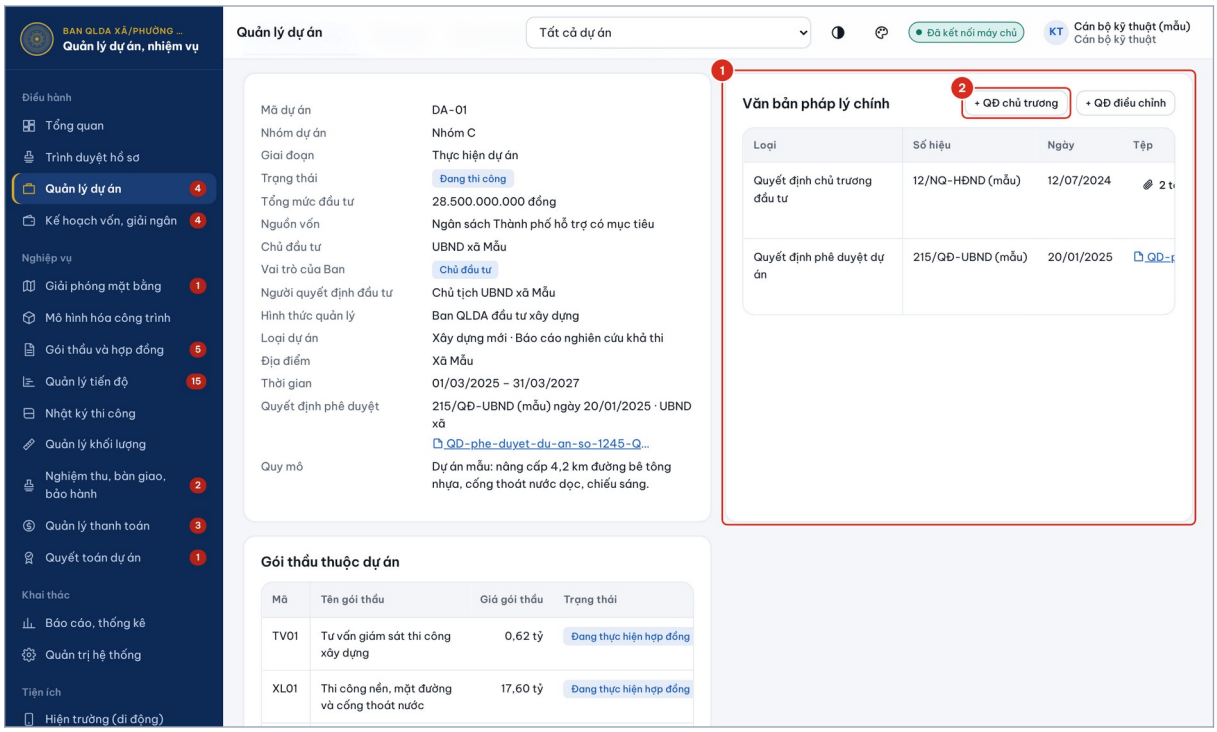

Hình 5.5. *Văn bản pháp lý chính của dự án*

Số	Ý nghĩa
1	Văn bản pháp lý chính và tệp đính kèm
2	Thêm quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh dự án


5.4. Quản lý hồ sơ pháp lý dự án

Bước 1. Mở chi tiết dự án, chọn thẻ **Hồ sơ pháp lý**, nhấn **+ Thêm hồ sơ** (1).

Bước 2. Chọn loại hồ sơ (quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, giấy phép xây dựng…), nhập số hiệu, ngày ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu; đính kèm một hoặc nhiều tệp (PDF, ảnh scan, Word, Excel).


Bước 3. Văn bản có thời hạn (giấy phép, bảo lãnh, chứng thư…): nhập **Hiệu lực đến**. Phần mềm cảnh báo trên trang Tổng quan từ 30 ngày trước khi hết hạn; ngày hiệu lực tô vàng khi sắp hết hạn, tô đỏ khi đã hết hạn.

Bước 4. Nhấn **Lưu**. Tệp đính kèm được lưu trên máy chủ; nhấn tên tệp trong danh sách để mở hoặc tải về.

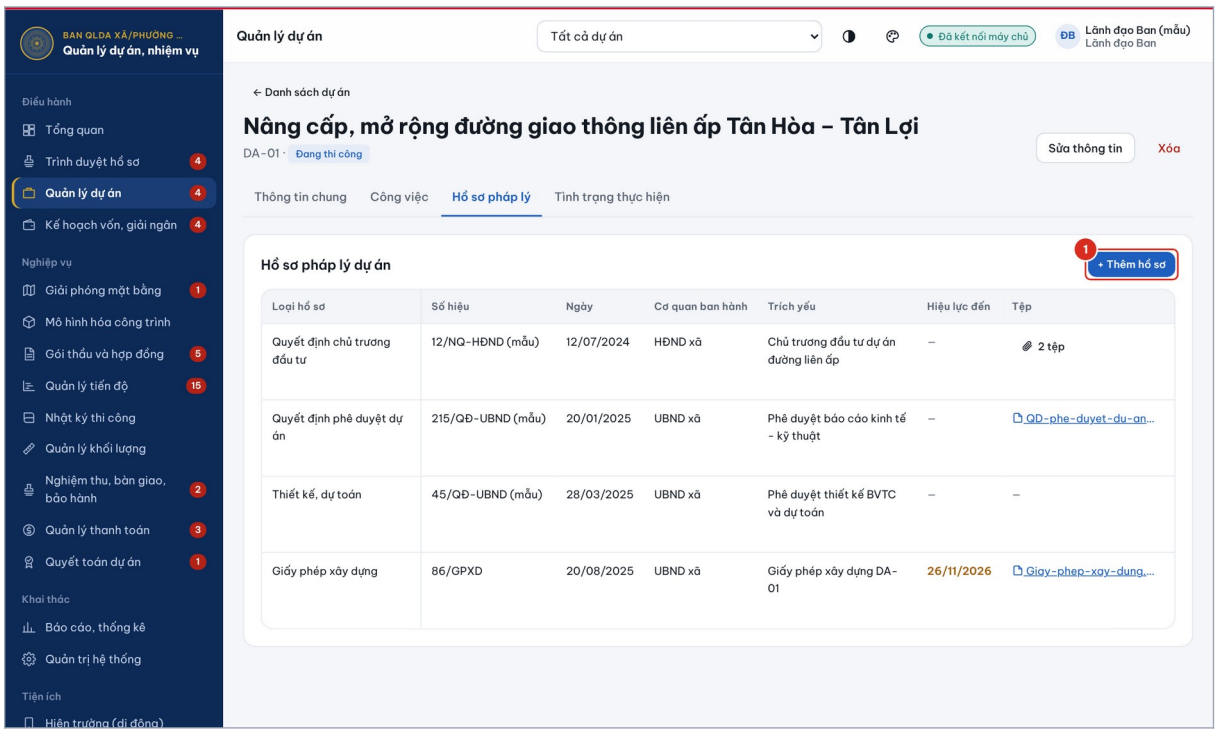

Hình 5.6. *Danh sách hồ sơ pháp lý của dự án*

Số	Ý nghĩa
1	Thêm hồ sơ pháp lý

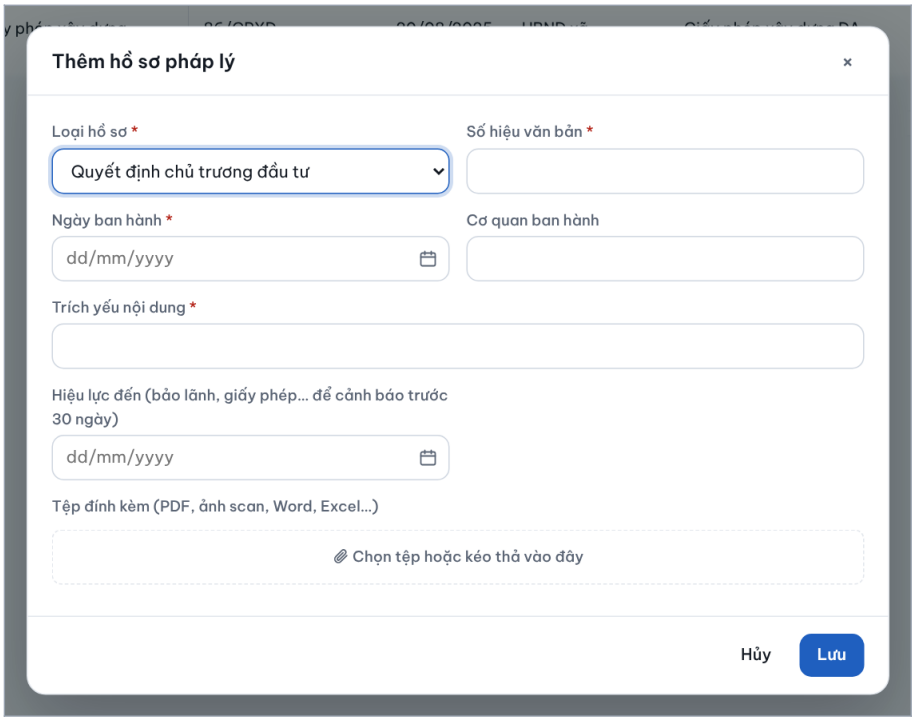

Hình 5.7. *Hộp nhập hồ sơ pháp lý*


5.5. Giao và theo dõi công việc

Bước 1. Mở chi tiết dự án, chọn thẻ **Công việc**, nhấn **+ Thêm công việc** **(1)**.

Bước 2. Nhập tên công việc, đơn vị hoặc người phụ trách, hạn hoàn thành, mức ưu tiên, trạng thái và ghi chú; đính kèm văn bản giao việc (nếu có); nhấn **Lưu**.


Bước 3. Khi công việc xong, nhấn **Hoàn thành** **(2)** trên dòng công việc, nhập ngày hoàn thành, kết quả và đính kèm tệp kết quả (văn bản, báo cáo, biên bản…);

nhấn **Xác nhận hoàn thành**. Công việc quá hạn được tô đỏ và đưa vào mục cảnh báo trên trang Tổng quan.

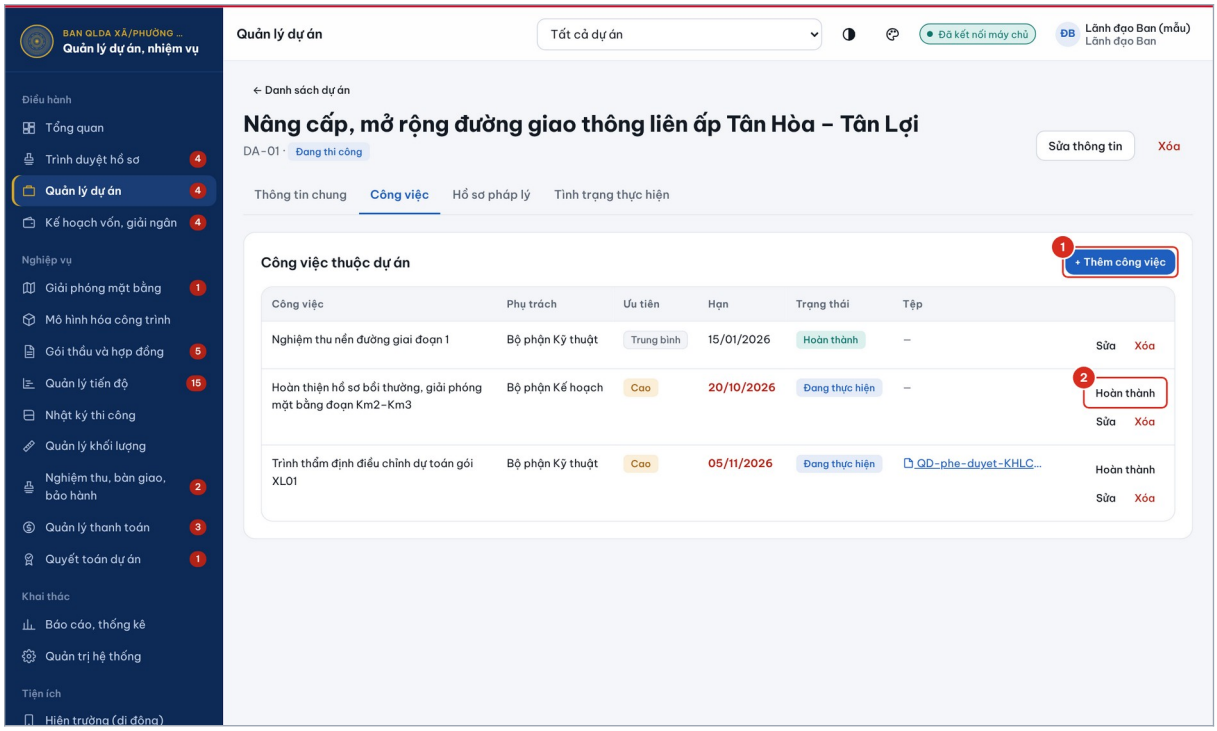

Hình 5.8. *Danh sách công việc của dự án*


Số	Ý nghĩa
1	Thêm công việc
2	Đánh dấu hoàn thành công việc

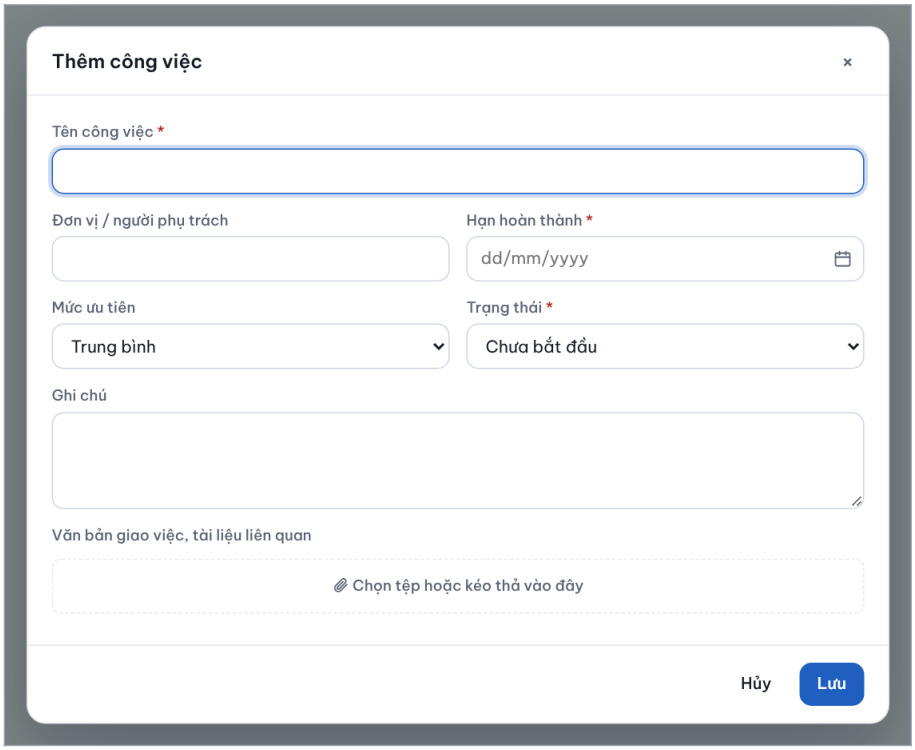

Hình 5.9. *Hộp thêm công việc*

6. KẾ HOẠCH VỐN, GIẢI NGÂN

Phân hệ **Kế hoạch vốn, giải ngân** theo dõi kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn được giao hằng năm (kể cả vốn điều chỉnh, kéo dài) và tiến độ giải ngân của từng dự án so với **kịch bản giải ngân** theo quý. Giá trị giải ngân được tính tự động từ hồ sơ thanh toán đã được Kho bạc chi, không phải nhập lại.

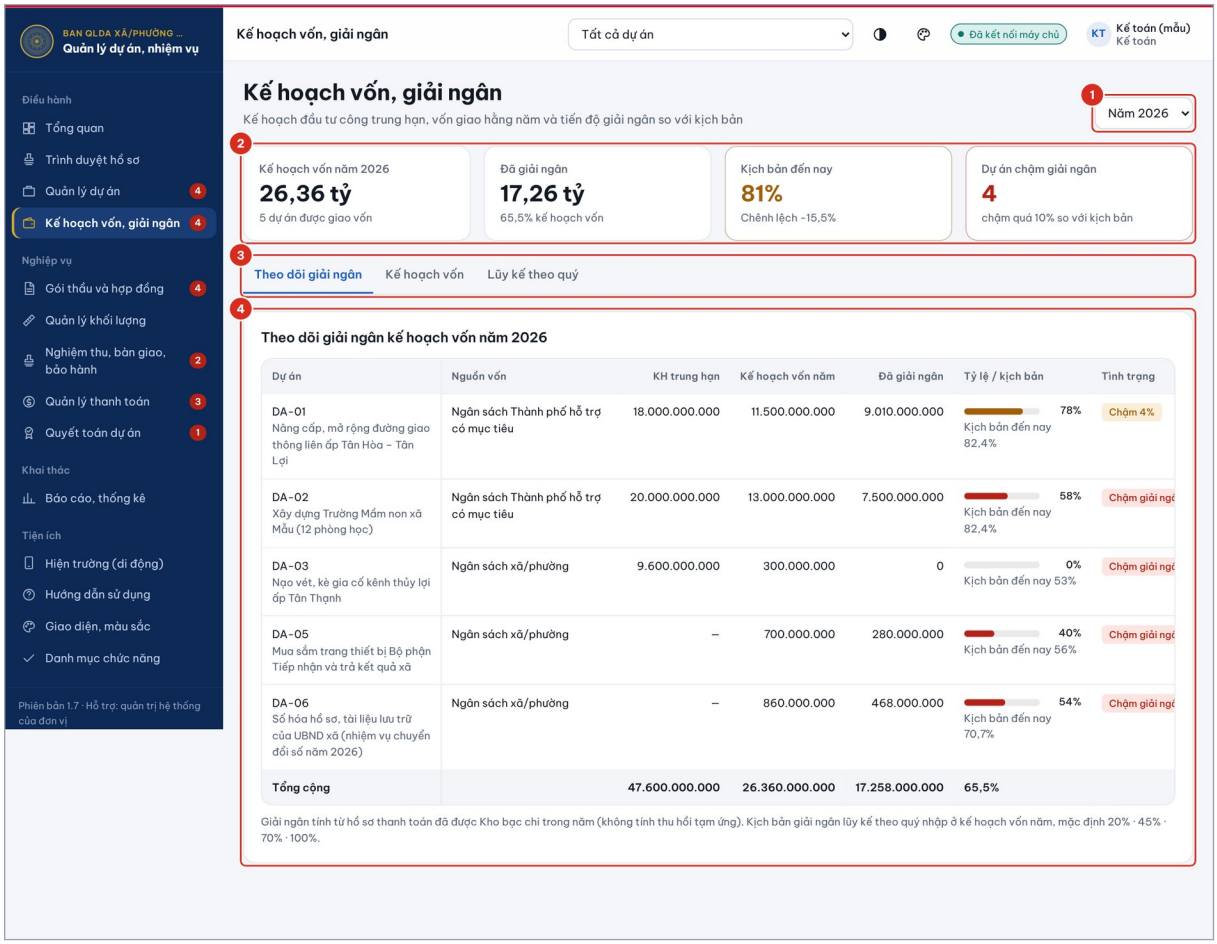

Hình 6.1. *Theo dõi giải ngân kế hoạch vốn năm*


Số	Ý nghĩa
1	Chọn năm kế hoạch
2	Chỉ tiêu chính: kế hoạch vốn năm, đã giải ngân, kịch bản đến ngày hiện tại, số dự án chậm giải ngân quá 10%
3	Các thẻ: Theo dõi giải ngân – Kế hoạch vốn – Lũy kế theo quý
4	Bảng giải ngân từng dự án: thanh tiến độ, kịch bản đến nay và tình trạng (đạt kịch bản / chậm)

Tình trạng **Đạt kịch bản** (xanh) khi tỷ lệ giải ngân bằng hoặc vượt kịch bản đến ngày hiện tại; **Chậm** (vàng) khi thấp hơn không quá 10%; **Chậm giải ngân** (đỏ) khi thấp hơn quá 10% – dự án này đồng thời được đưa vào mục cảnh báo trên trang Tổng quan.

Thẻ **Kế hoạch vốn** liệt kê các quyết định giao vốn của từng dự án (trung hạn, năm, bổ sung, điều chỉnh) kèm tệp quyết định; nhấn tên tệp để xem.

6.1. Lũy kế giải ngân theo quý


Thẻ **Lũy kế theo quý** so sánh kịch bản và thực tế giải ngân lũy kế từng quý của năm đã chọn, kèm tỷ lệ đạt kịch bản và tỷ lệ so với kế hoạch vốn năm; dùng khi báo cáo giải ngân định kỳ.

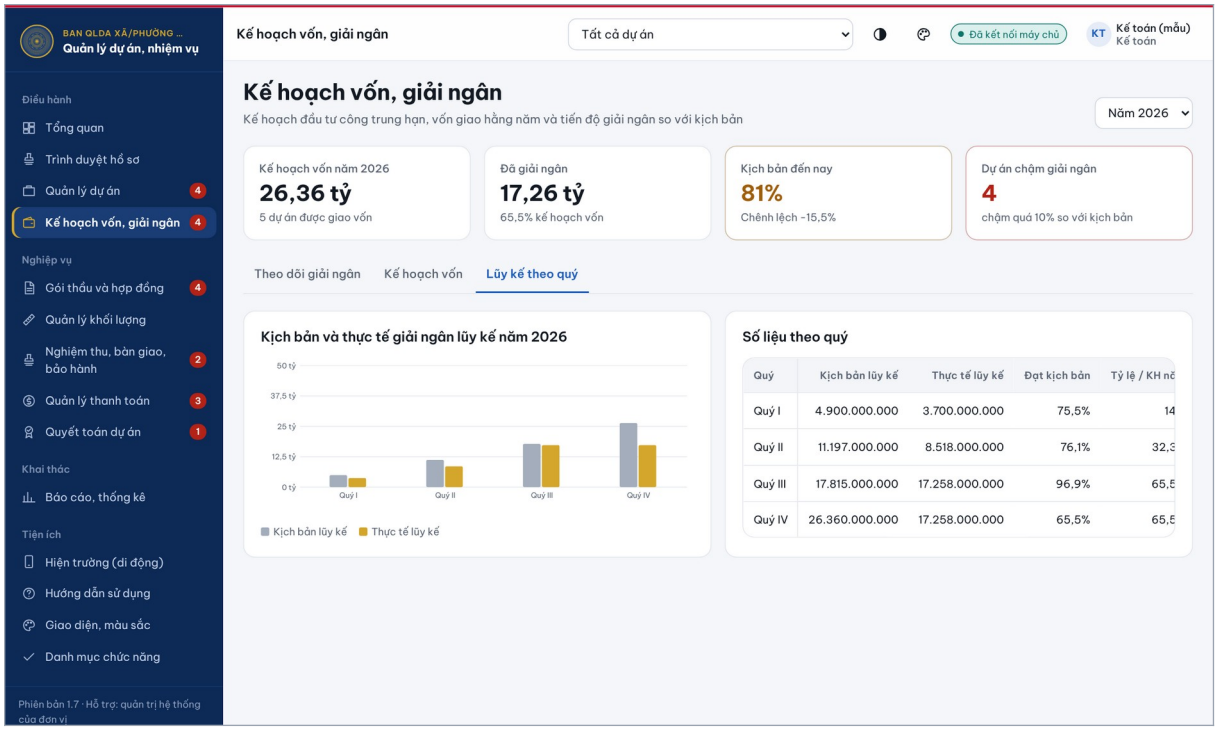

Hình 6.2. *Kịch bản và thực tế giải ngân lũy kế theo quý*

7. GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Phân hệ **Giải phóng mặt bằng** theo dõi từng khu vực, đoạn tuyến phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: số hộ bị ảnh hưởng và đã chi trả, diện tích thu hồi và đã bàn giao, kinh phí theo phương án và đã chi trả, hạn bàn giao mặt bằng cho thi công.

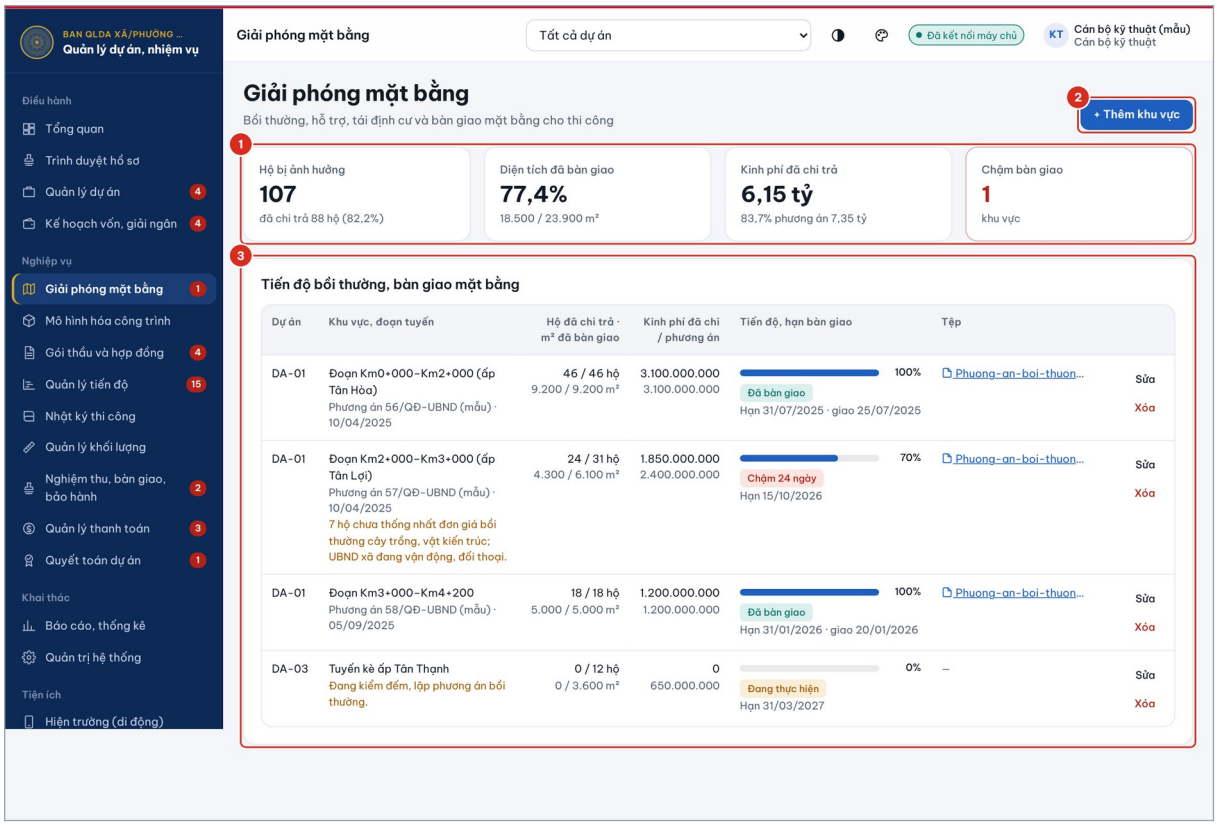


Hình 7.1. *Tiến độ bồi thường, bàn giao mặt bằng*

Số	Ý nghĩa
1	Chỉ tiêu chính: hộ đã chi trả, diện tích đã bàn giao, kinh phí đã chi trả, số khu vực chậm bàn giao
2	Thêm khu vực giải phóng mặt bằng (chỉ hiện với tài khoản có quyền cập nhật)
3	Bảng tiến độ từng khu vực: tiến độ, tình trạng, vướng mắc và tệp đính kèm

Lưu ý: *Tiến độ khu vực tính theo diện tích đã bàn giao so với diện tích thu hồi. Khu vực quá hạn bàn giao mà chưa bàn giao được tô đỏ và đưa vào mục cảnh báo trên trang Tổng quan để chỉ đạo tháo gỡ.*

8. THEO DÕI TIẾN ĐỘ


Phân hệ **Quản lý tiến độ** hiển thị danh sách cảnh báo chậm tiến độ **(1)**: hạng mục quá hạn (nền đỏ) và hạng mục chậm so với kế hoạch (nền vàng), kèm tỷ lệ thực tế so với kế hoạch đến ngày hiện tại.

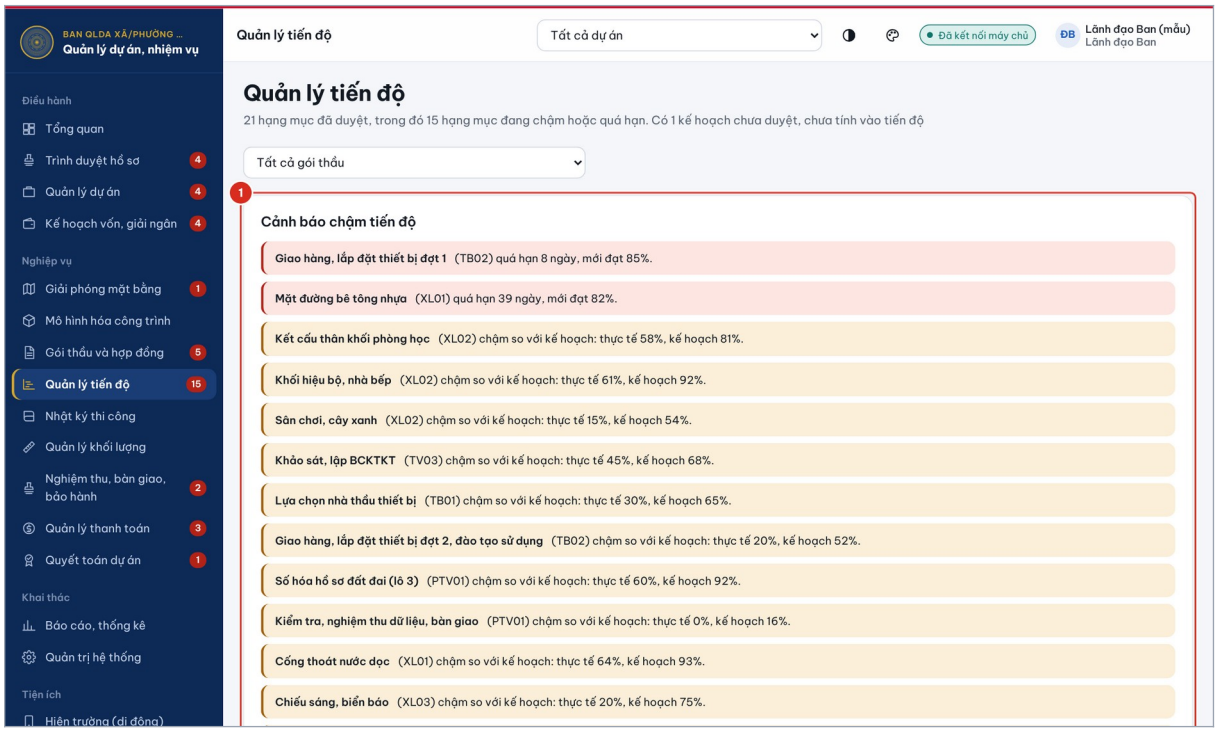

Hình 8.1. *Cảnh báo chậm tiến độ*

Số	Ý nghĩa
1	Danh sách cảnh báo chậm tiến độ

Phần **Theo dõi tiến độ** có hai cách xem **(1)**: **Theo dự án** và **Theo gói thầu**, cho biết tiến độ kế hoạch đến nay, thực tế, chênh lệch và số hạng mục chậm. Bên dưới là **Biểu đồ tiến độ (Gantt)**: thanh nhạt là thời gian kế hoạch, phần đậm là khối lượng đã hoàn thành, đường đứt nét đỏ là ngày hiện tại.

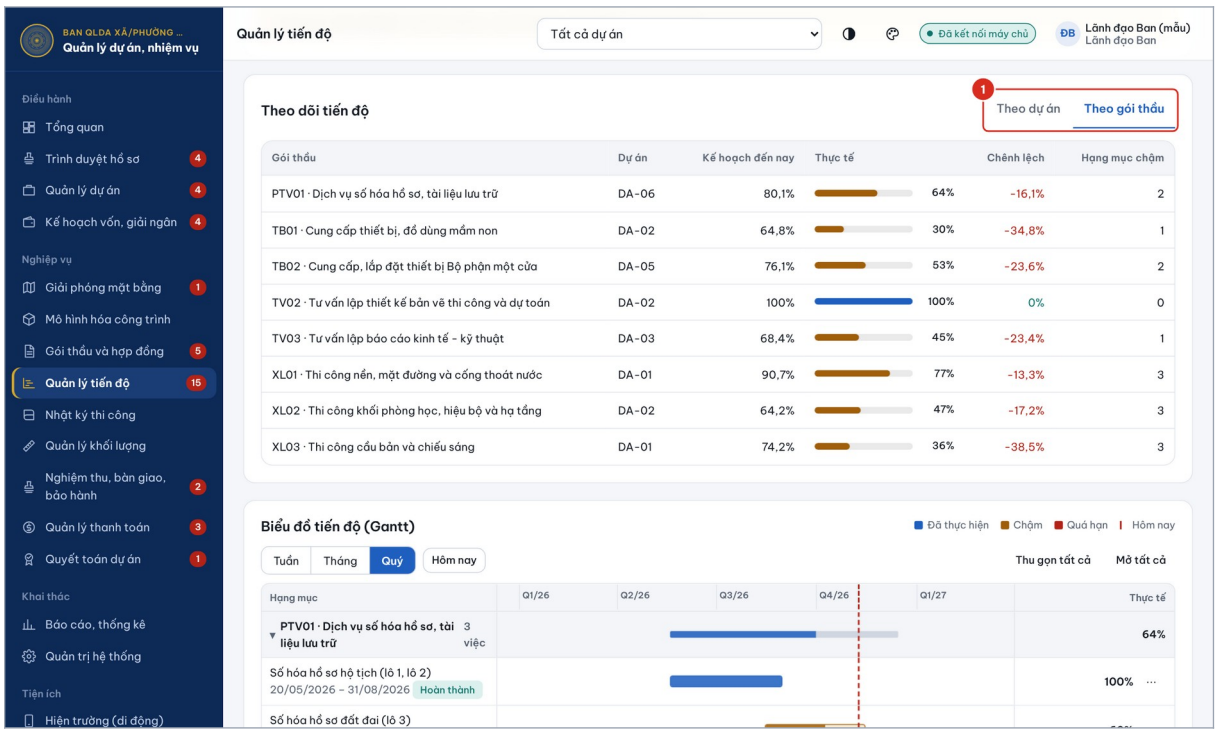


Hình 8.2. *Theo dõi tiến độ và biểu đồ Gantt*

Số	Ý nghĩa
1	Chuyển cách xem theo dự án hoặc theo gói thầu

8.1. Công cụ của biểu đồ tiến độ

- **Tuần, Tháng, Quý (1)**: chọn thang thời gian ở góc trên biểu đồ; phần mềm nhớ lựa chọn cho lần mở sau.
- **Hôm nay (2)**: khi mở trang, biểu đồ tự cuộn tới ngày hiện tại (đường đỏ nét đứt **(5)**); sau khi cuộn đi xem, nhấn nút này để quay về.
- **Thu gọn tất cả, Mở tất cả (3)** và nhấn tên gói thầu **(4)** để thu gọn hoặc mở từng gói; dòng gói thầu thu gọn vẫn hiện thanh tổng và phần trăm tiến độ. Phần mềm nhớ các gói đã thu gọn theo từng người dùng.
- Khi cuộn ngang, cột Hạng mục bên trái và cột Thực tế bên phải đứng yên, chỉ phần biểu đồ cuộn. Nhấn tên công việc để xem chi tiết và lịch sử cập nhật.

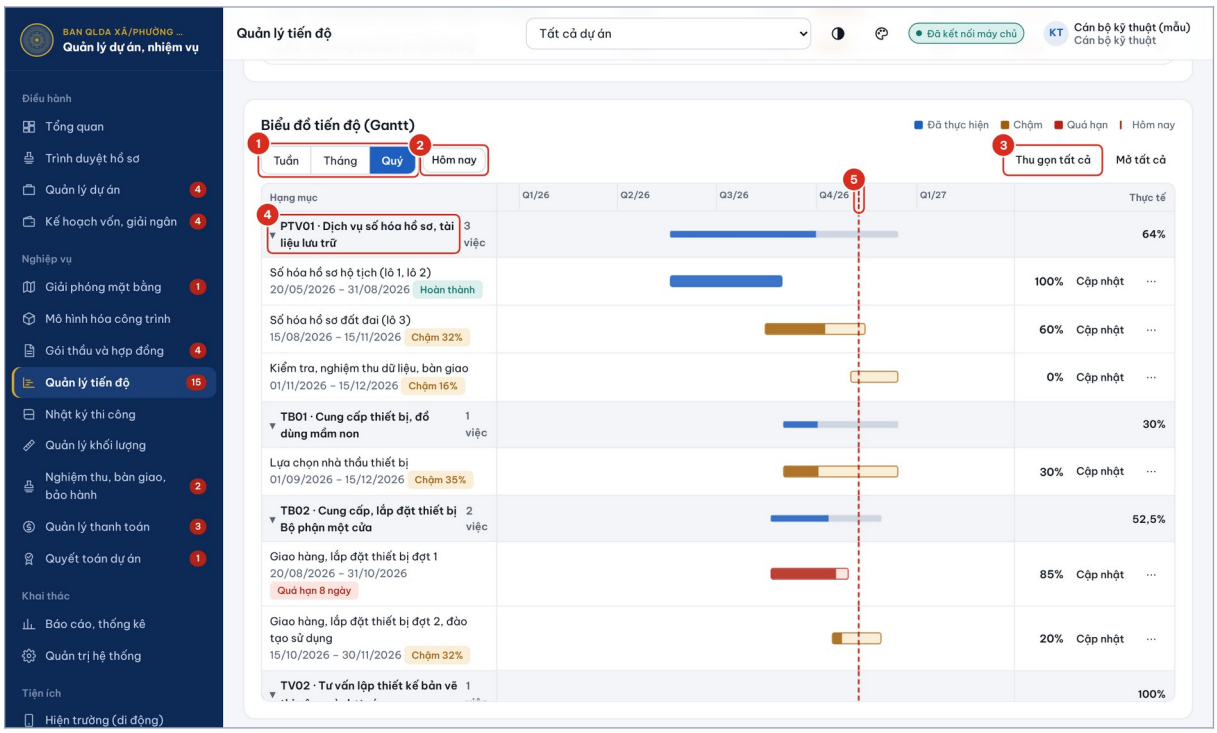


Hình 8.3. *Biểu đồ tiến độ xem theo quý, gói thầu thu gọn*

Số	Ý nghĩa
1	Chọn thang thời gian Tuần, Tháng, Quý
2	Quay về ngày hiện tại
3	Thu gọn hoặc mở tất cả gói thầu
4	Nhấn tên gói thầu để thu gọn hoặc mở
5	Đường ngày hiện tại

Lưu ý: *Tiến độ của dự án được tính bình quân theo giá trị các gói thầu (gói thầu giá trị lớn ảnh hưởng nhiều hơn), không tính bình quân đơn giản. Tiến độ gói thầu tính theo trọng số các hạng mục. Chỉ kế hoạch tiến độ đã được Lãnh đạo Ban duyệt mới được tính; kế hoạch đang soạn hoặc chờ duyệt hiện nền nhạt kèm nhãn trạng thái.*

9. NGHIỆM THU, BÀN GIAO, BẢO HÀNH

Phân hệ **Nghiệm thu, bàn giao, bảo hành** lưu biên bản nghiệm thu theo giai đoạn thi công, nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình, bàn giao đưa vào sử dụng (theo Nghị định 207/2026/NĐ-CP) và theo dõi thời hạn bảo hành, bảo lãnh bảo hành của từng công trình.

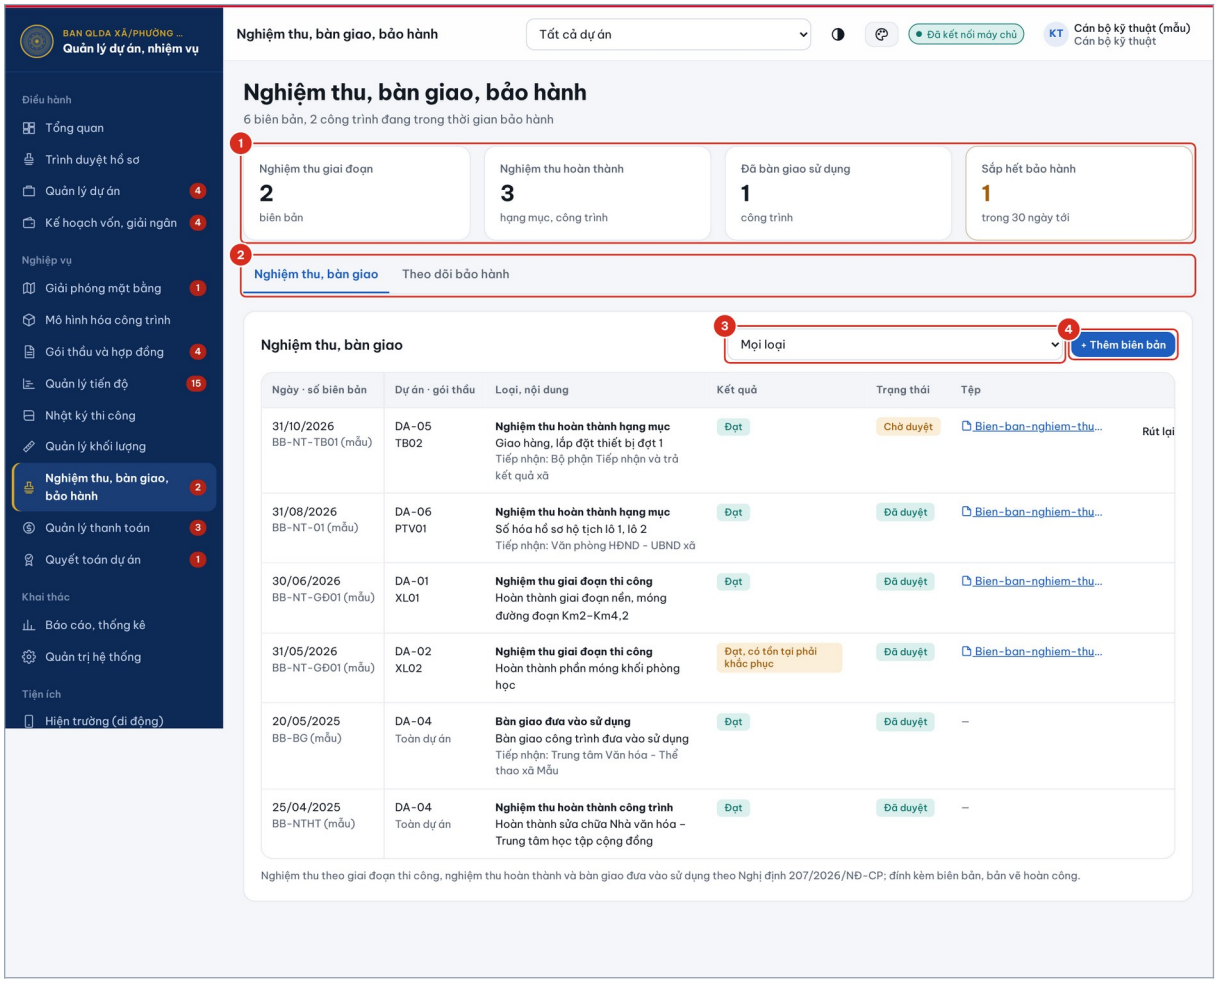


Hình 9.1. *Danh sách nghiệm thu, bàn giao*

Số	Ý nghĩa
1	Chỉ tiêu: số biên bản nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành, công trình đã bàn giao, công trình sắp hết bảo hành
2	Các thẻ: Nghiệm thu, bàn giao – Theo dõi bảo hành
3	Lọc theo loại nghiệm thu, bàn giao
4	Thêm biên bản (chỉ hiện với tài khoản có quyền cập nhật)

9.1. Theo dõi bảo hành công trình


Thẻ **Theo dõi bảo hành** liệt kê các công trình có thời hạn bảo hành, sắp xếp theo ngày hết bảo hành. Phần mềm cảnh báo trước 30 ngày khi sắp hết bảo hành hoặc hết bảo lãnh bảo hành để Ban kiểm tra hiện trạng, yêu cầu nhà thầu sửa chữa trước khi hoàn trả bảo lãnh.

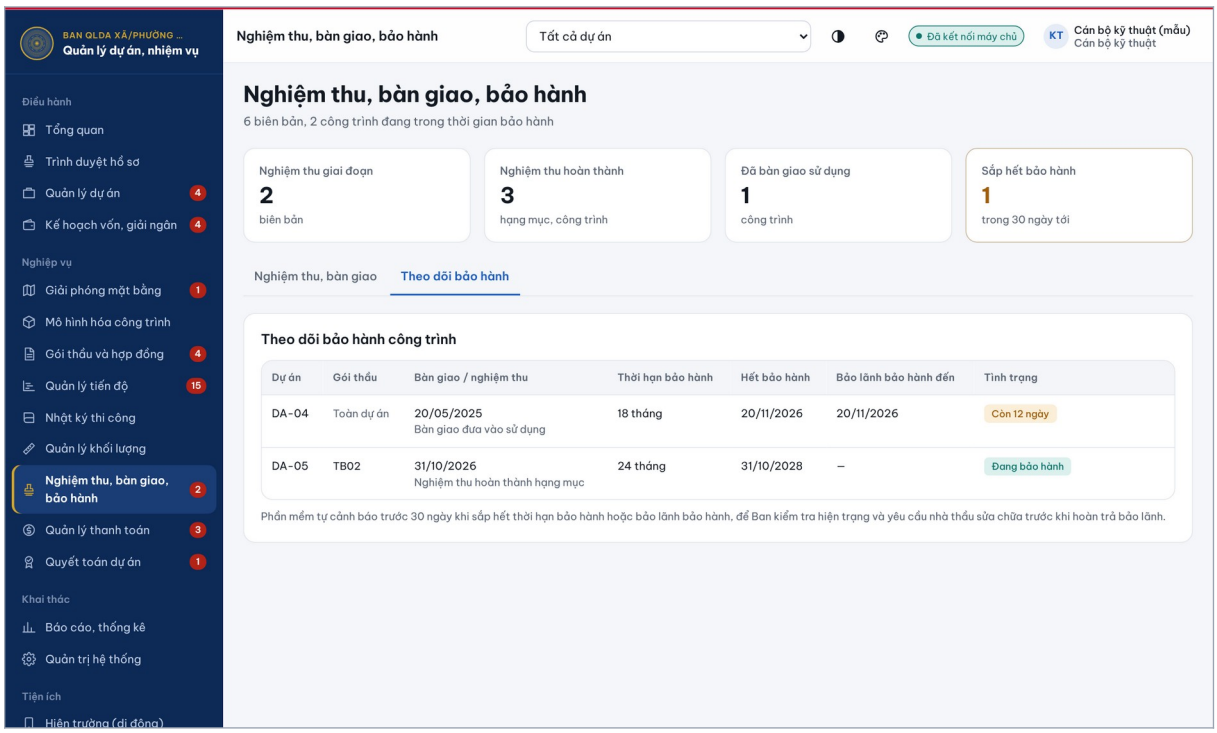

Hình 9.2. *Theo dõi bảo hành công trình*

10. QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Phân hệ **Quyết toán dự án** theo dõi từng dự án hoàn thành từ khi bàn giao đến khi tất toán tài khoản: hạn lập báo cáo quyết toán, ngày trình thẩm tra, giá trị đề nghị – thẩm tra – phê duyệt, quyết định phê duyệt và ngày tất toán.

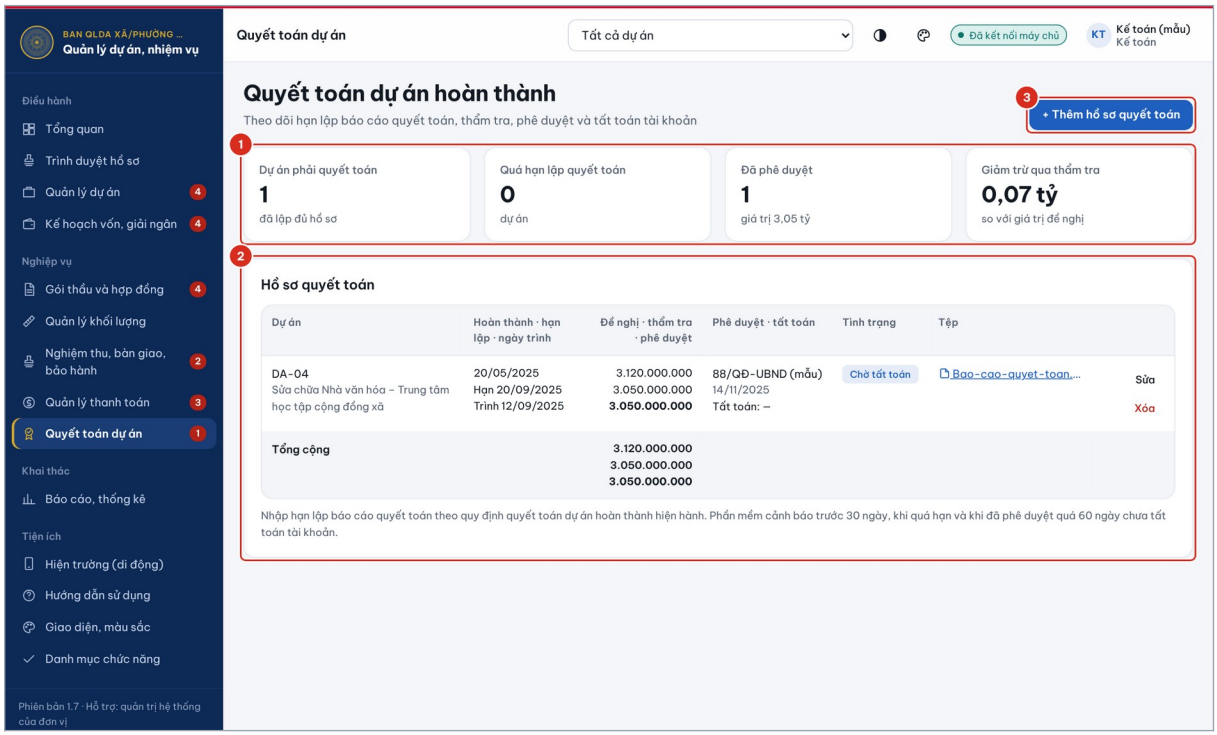

Hình 10.1. *Quyết toán dự án hoàn thành*

Số	Ý nghĩa
1	Chỉ tiêu: dự án phải quyết toán, quá hạn lập quyết toán, đã phê duyệt, giá trị giảm trừ qua thẩm tra
2	Bảng hồ sơ quyết toán: thời hạn, giá trị đề nghị – thẩm tra – phê duyệt, tất toán và tình trạng
3	Thêm hồ sơ quyết toán (chỉ hiện với tài khoản có quyền cập nhật)

Dự án đã hoàn thành, bàn giao nhưng chưa có hồ sơ quyết toán được liệt kê riêng ở khung **Dự án đã hoàn thành chưa lập hồ sơ quyết toán** phía trên bảng, để Ban không bỏ sót.

> ***Lưu ý:*** *Phần mềm cảnh báo trước 30 ngày khi sắp đến hạn lập báo cáo quyết toán, khi đã quá hạn và khi đã phê duyệt quá 60 ngày nhưng chưa tất toán tài khoản – giúp Ban không bị nhắc nhở, phê bình vì chậm quyết toán.*

11. KHAI THÁC BÁO CÁO, THỐNG KÊ

Phân hệ **Báo cáo, thống kê** cho phép lọc, tra cứu, in và xuất 07 loại báo cáo ra tệp Excel, PDF hoặc CSV:

- Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện dự án;
- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án và các gói thầu;
- Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng;
- Báo cáo khối lượng thực hiện, nghiệm thu và thanh toán;
- Báo cáo tổng hợp theo dự án, gói thầu và thời gian;
- Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (so với kịch bản);
- Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành.


Bước 1. Chọn **Báo cáo, thống kê** trên thanh chức năng.

Bước 2. Chọn loại báo cáo **(1)**, dự án **(2)**, gói thầu **(3)**; nhập khoảng thời gian «Từ – Đến» và từ khóa tra cứu nếu cần. Bảng số liệu hiển thị ngay bên dưới.

Bước 3. Nhấn **Xuất Excel (4)** để tải tệp báo cáo về máy. Tệp có sẵn tên đơn vị, tên báo cáo, dòng tiêu đề tô màu, kẻ khung, số tiền có dấu phân cách, dòng tổng in đậm và căn vừa khổ A4 khi in; mở được bằng Microsoft Excel hoặc LibreOffice.


Bước 4. Nhấn **In / Xuất PDF (5)** để mở trang in khổ A4 nằm ngang, có quốc hiệu, tên đơn vị, số thứ tự, dòng tổng cộng và khung ký «Người lập biểu – Thủ trưởng đơn vị». Trong hộp thoại in, chọn máy in để in ngay hoặc chọn **Lưu thành PDF** để lưu tệp gửi cấp trên.

Bước 5. Nhấn **Xuất CSV (6)** để tải dữ liệu dạng CSV (tiếng Việt hiển thị đúng khi mở bằng Excel) dùng cho tổng hợp; nhấn **Xuất JSON** (nút cuối cùng trên hàng nút) khi cần chuyển số liệu sang phần mềm khác.

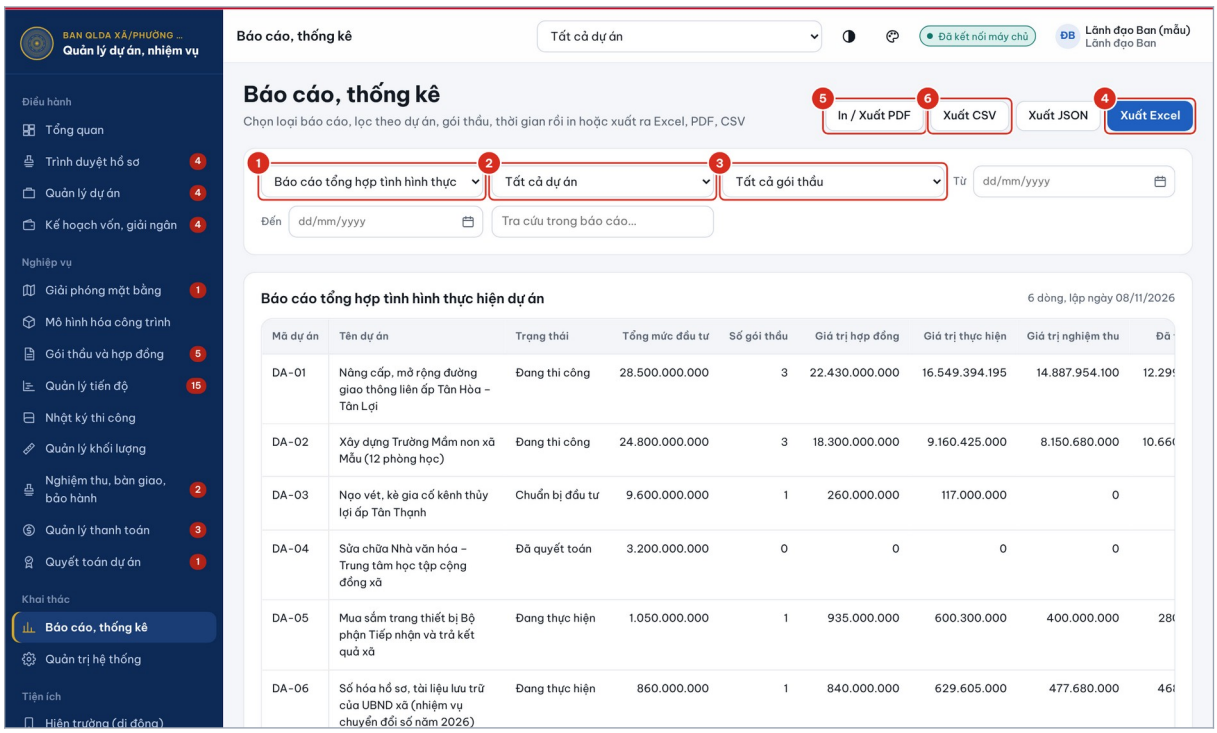


Hình 11.1. *Trang Báo cáo, thống kê*

Số	Ý nghĩa
1	Chọn loại báo cáo
2	Lọc theo dự án
3	Lọc theo gói thầu
4	Xuất báo cáo ra Excel
5	In hoặc lưu báo cáo thành PDF
6	Xuất báo cáo ra CSV

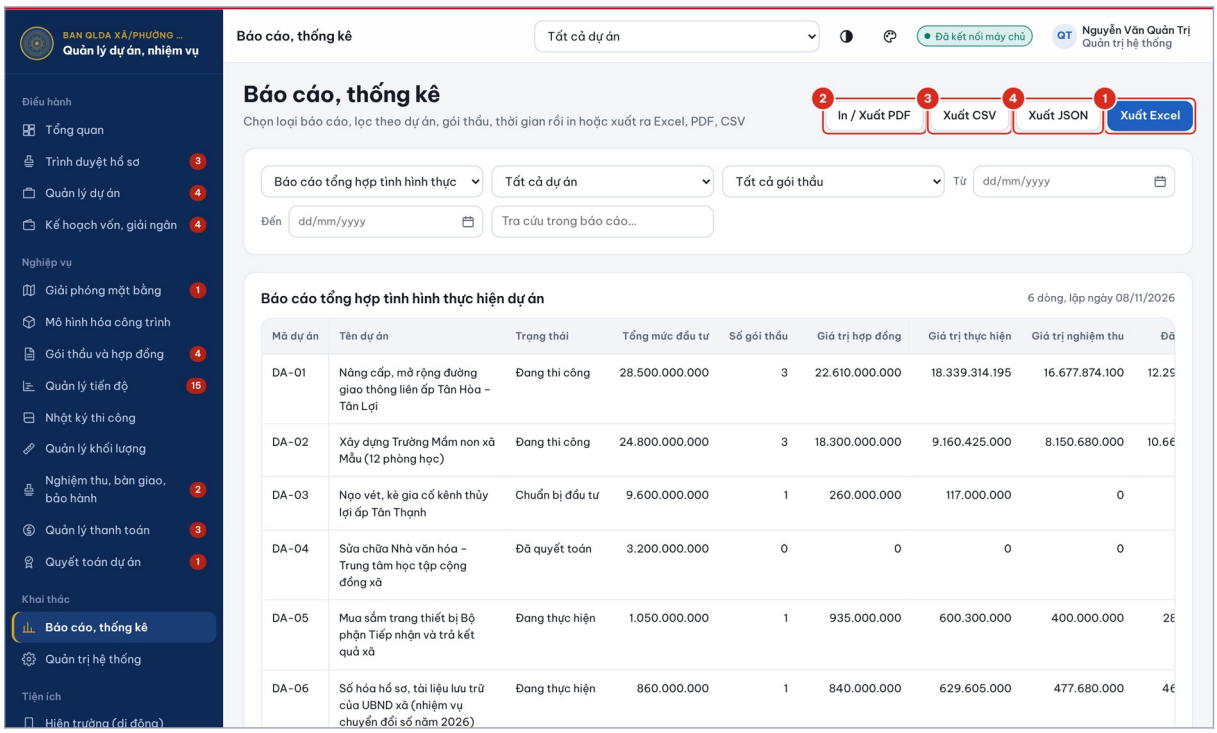

Hình 11.2. *Hàng nút xuất báo cáo*

Số	Ý nghĩa
1	Xuất Excel
2	In hoặc lưu thành PDF
3	Xuất CSV
4	Xuất JSON để chuyển sang phần mềm khác

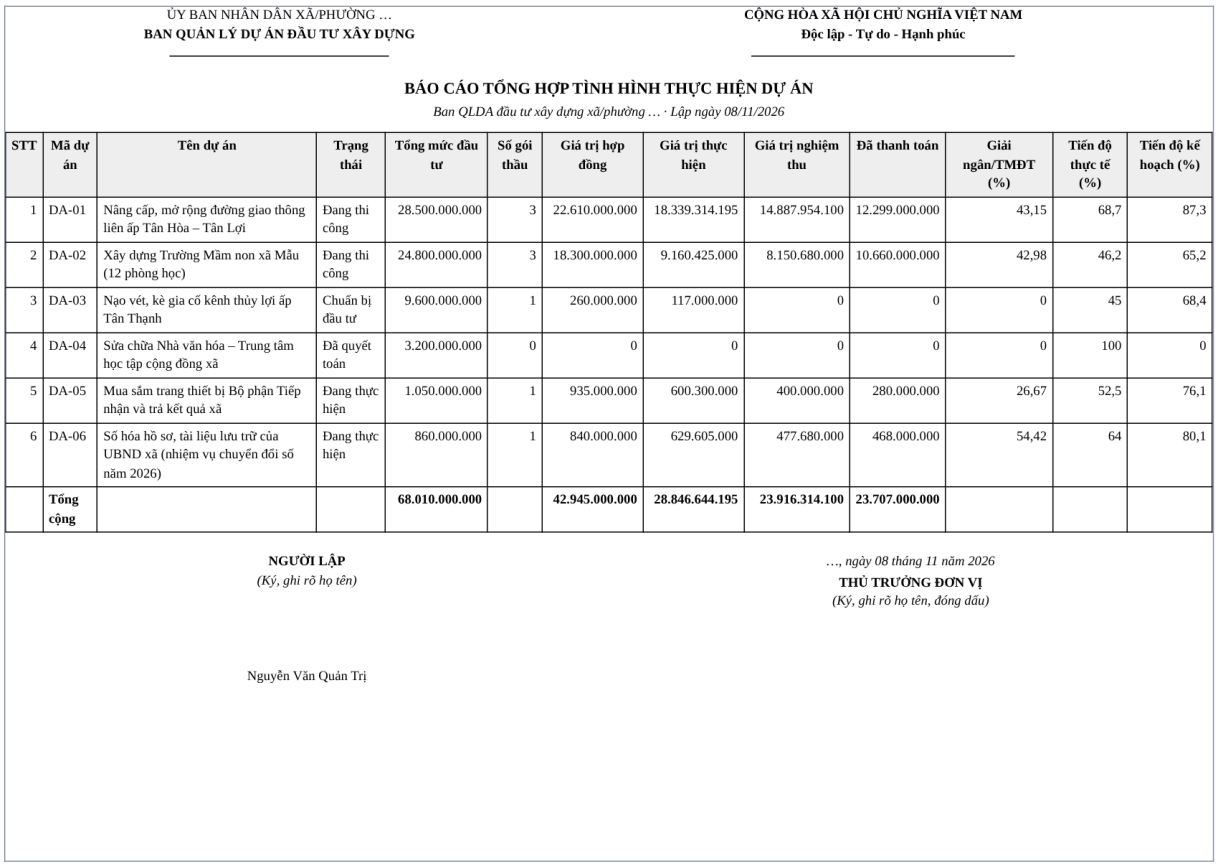

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG …
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Ban QLDA đầu tư xây dựng xã/phường … · Lập ngày 08/11/2026


STT	Mã dự án	Tên dự án	Trạng thái	Tổng mức đầu tư	Số gói thầu	Giá trị hợp đồng	Giá trị thực hiện	Giá trị nghiệm thu	Đã thanh toán	Giải ngân/TMĐT (%)	Tiến độ thực tế (%)	Tiến độ kế hoạch (%)
1	DA-01	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên ấp Tân Hòa – Tân Lợi	Đang thi công	28.500.000.000	3	22.610.000.000	18.339.314.195	14.887.954.100	12.299.000.000	43,15	68,7	87,3
2	DA-02	Xây dựng Trường Mầm non xã Mẫu (12 phòng học)	Đang thi công	24.800.000.000	3	18.300.000.000	9.160.425.000	8.150.680.000	10.660.000.000	42,98	46,2	65,2
3	DA-03	Nạo vét, kè gia cố kênh thủy lợi ấp Tân Thạnh	Chuẩn bị đầu tư	9.600.000.000	1	260.000.000	117.000.000	0	0	0	45	68,4
4	DA-04	Sửa chữa Nhà văn hóa – Trung tâm học tập cộng đồng xã	Đã quyết toán	3.200.000.000	0	0	0	0	0	0	100	0
5	DA-05	Mua sắm trang thiết bị Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã	Đang thực hiện	1.050.000.000	1	935.000.000	600.300.000	400.000.000	280.000.000	26,67	52,5	76,1
6	DA-06	Số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ của UBND xã (nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026)	Đang thực hiện	860.000.000	1	840.000.000	629.605.000	477.680.000	468.000.000	54,42	64	80,1
	Tổng cộng			**68.010.000.000**		**42.945.000.000**	**28.846.644.195**	**23.916.314.100**	**23.707.000.000**			

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Quản Trị

…, ngày 08 tháng 11 năm 2026
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hình 11.3. *Mẫu báo cáo in, xuất PDF*

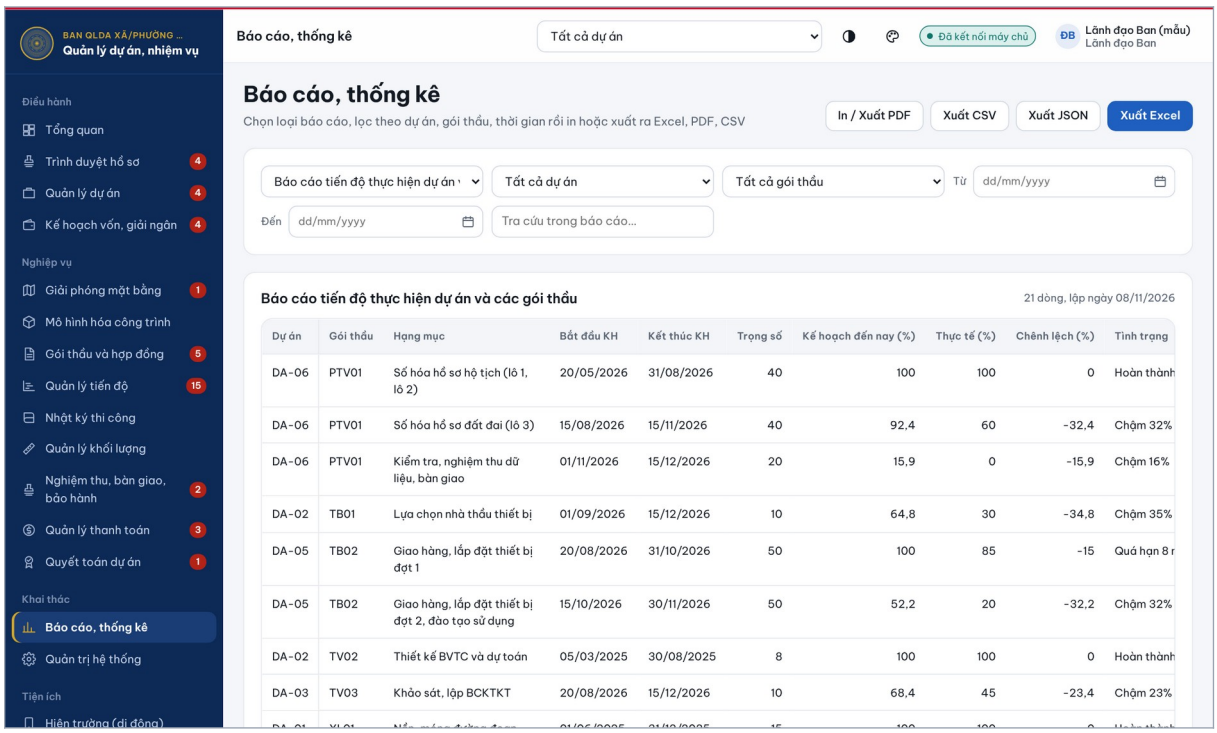

Hình 11.4. *Ví dụ báo cáo tiến độ thực hiện dự án và các gói thầu*

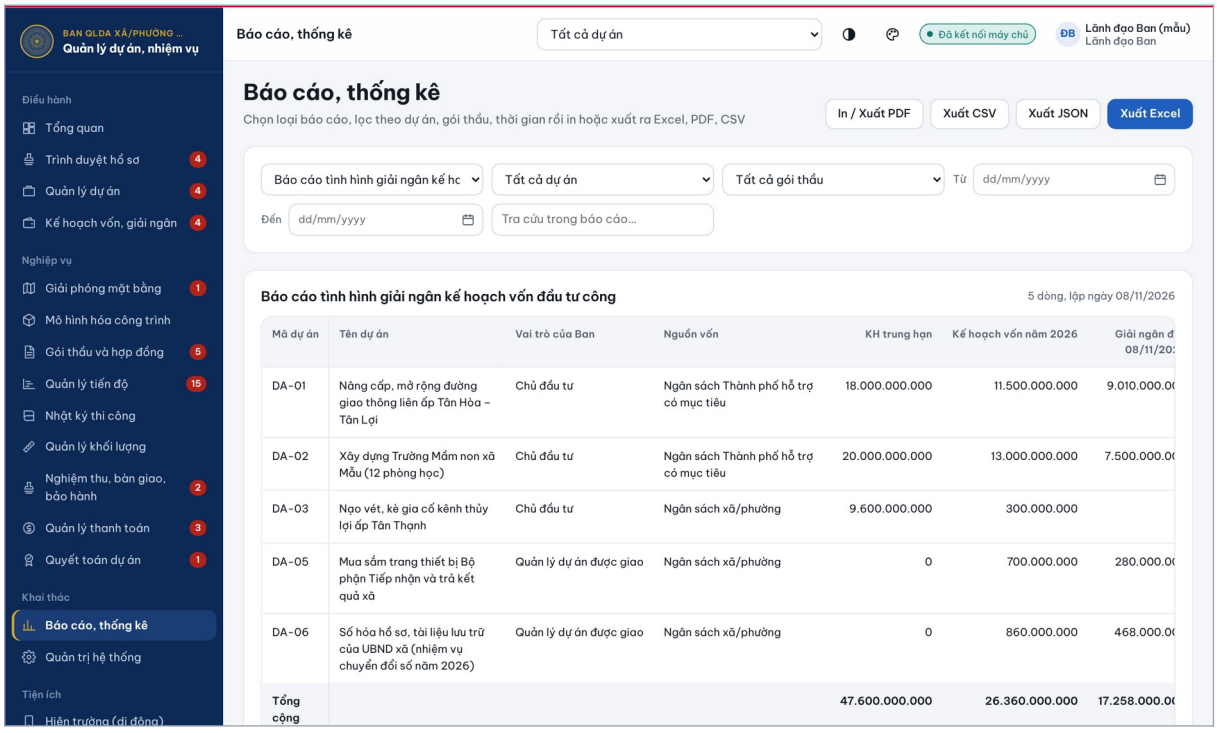

Hình 11.5. *Ví dụ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn*

> ***Lưu ý:*** *Tệp Excel xuất ra có tên đơn vị (thiết lập tại Quản trị hệ thống → Thông tin đơn vị), tên báo cáo và điều kiện lọc; có thể chỉnh sửa, in ấn, gửi báo cáo cấp trên ngay.*

12. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ HỖ TRỢ

Bảng 12.1. *Một số tình huống thường gặp*

Tình huống	Cách xử lý
Không đăng nhập được, báo sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	Kiểm tra bộ gõ tiếng Việt và phím Caps Lock. Sau 5 lần sai tài khoản bị khóa 15 phút; liên hệ quản trị hệ thống nếu quên mật khẩu.
Thông báo «Tài khoản đã bị khóa»	Tài khoản bị quản trị hệ thống khóa hoặc đang trong thời gian khóa tạm. Liên hệ quản trị hệ thống.
Màn hình báo «Tạm ngừng phục vụ» thay cho trang đăng nhập	Dịch vụ phần mềm của đơn vị đang tạm ngừng, thường do hợp đồng thuê dịch vụ chưa được gia hạn; lý do ghi ngay trên màn hình. Dữ liệu vẫn được giữ nguyên. Báo lãnh đạo Ban để liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ.
Không thấy một chức năng trên thanh bên trái	Nhóm người dùng của tài khoản chưa được cấp quyền phân hệ đó. Đề nghị quản trị hệ thống xem lại phân quyền.
Không thấy dữ liệu của một dự án	Kiểm tra ô chọn dự án ở thanh công cụ phía trên; nếu vẫn không thấy, tài khoản chưa được giao phạm vi dự án đó.
Trang Tổng quan báo «chậm giải ngân»	Tỷ lệ giải ngân của dự án thấp hơn kịch bản đến ngày hiện tại quá 10%. Mở **Kế hoạch vốn, giải ngân** để xem chi tiết; kiểm tra các hồ sơ thanh toán đã được xác nhận đã chi.
Không xóa được một bản ghi	Bản ghi còn dữ liệu liên quan (ví dụ gói thầu còn hợp đồng, hợp đồng còn khối lượng). Xử lý các bản ghi liên quan trước.
Màn hình báo mất kết nối	Kiểm tra mạng; phần mềm tự kết nối lại. Thông tin đang nhập dở trong hộp nhập liệu chưa được lưu cho đến khi nhấn Lưu thành công.
Tải tệp đính kèm không được	Mỗi tệp tối đa 500 MB; phần mềm không nhận tệp chương trình (.exe, .bat…) vì lý do an toàn.
Gỡ nhầm tệp đính kèm hoặc xóa nhầm bản ghi có tệp	Báo quản trị hệ thống trong vòng 30 ngày để khôi phục tệp từ thùng rác.
Không sửa, không xóa được kế hoạch tiến độ, đợt nghiệm thu, phụ lục, hồ sơ thanh toán, biên bản nghiệm thu	Hồ sơ đang chờ xác nhận, chờ duyệt hoặc đã được duyệt nên bị khóa. Hồ sơ đang chờ: nhấn **Rút lại** để sửa tiếp. Hồ sơ đã duyệt: đề nghị Lãnh đạo Ban **Thu hồi** về soạn thảo (ghi rõ lý do).
Đã lập kế hoạch tiến độ nhưng tiến độ kế hoạch, cảnh báo chậm tiến độ không thay đổi	Chỉ kế hoạch tiến độ **đã duyệt** mới được tính. Kế hoạch đang soạn hoặc chờ duyệt hiện nền nhạt trên biểu đồ Gantt; trình duyệt và đề nghị Lãnh đạo Ban duyệt.
Đã lập đợt nghiệm thu nhưng khối lượng nghiệm thu của hợp đồng chưa tăng	Đợt chỉ được tính khi ở trạng thái **Đã nghiệm thu**: Cán bộ kỹ thuật trình, Tư vấn giám sát xác nhận khối lượng, Lãnh đạo Ban duyệt. Xem trạng thái đợt ở thẻ Theo dõi nghiệm thu.
Hồ sơ thanh toán khối lượng không trình được, báo vượt giá trị đã nghiệm thu	Lũy kế thanh toán khối lượng của hợp đồng không được vượt giá trị khối lượng đã nghiệm thu được duyệt. Duyệt thêm đợt nghiệm thu hoặc giảm giá trị đề nghị.

Tình huống	Cách xử lý
Phụ lục hợp đồng đã nhập nhưng giá trị hợp đồng không thay đổi	Chỉ phụ lục **đã duyệt** mới được cộng vào giá trị và thời hạn hợp đồng. Kiểm tra trạng thái phụ lục tại khung Điều chỉnh, phụ lục hoặc trang **Trình duyệt hồ sơ**.
Không mở được tệp, báo «không có quyền»	Tệp thuộc dự án nằm ngoài phạm vi được giao cho tài khoản. Đề nghị quản trị hệ thống kiểm tra phạm vi dữ liệu của nhóm.

Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật: quản trị hệ thống của Ban Quản lý dự án; đơn vị phát triển phần mềm: Công ty Cổ phần Tin học Tri Thức. Khi báo lỗi, đề nghị ghi rõ tên đăng nhập, thời điểm, trang đang thao tác và chụp màn hình thông báo lỗi (nếu có).
